



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Projectplan Verbreding waterloop Texel

Locatie Laanweg

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3077585
kenmerk document: Bijlage 1/3
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de teamleider Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben

Auteur
K.S de Boer

Registratienummer
21.0961049

Datum
20 september 2021

Versie
0.2
Status
concept

Afdeling
Watersystemen



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Aanleiding	3
1.1 Huidige situatie	3
1.2 Gewenste situatie	3
2 Voorgenomen werkzaamheden	3
2.1 Ligging en begrenzing van het projectgebied	3
2.2 Uit te voeren werken.	4
2.3 Maatvoering	5
2.4 Effecten op de omgeving	8
2.4.1 Belanghebbenden	8
2.4.2 Natuur	8
2.4.3 Water	10
2.4.4 Bodem	10
2.4.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie	10
2.4.6 Niet gesprongen explosieven	12
2.4.7 Kabels en leidingen	12
2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering	13
2.5.1 Beschikbaarheid van de benodigde grond	13
2.5.2 Vergunningen	13
2.6 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering	13
2.7 Beheer en onderhoud	14
2.8 Schade en nadeelcompensatie	14
2.9 Rechtsbescherming	14
3 Bijlagen	17
1.1 Bijlage 1. Natuurtoets	17
1.2 Bijlage 4. Niet Gesprongen Explosieven (NGE)	17
1.3 Bijlage 5. Archeologie	17



Samenvatting

1 Aanleiding

Dit projectplan richt zich op de verbetering van het watersysteem rond Den Burg op Texel. In het kader van de watercompensatie vanuit de dijkversterking Waddenzeedijk Texel is reeds een deel van het tracé verbreed. Met de realisatie van dit tweede deel zijn de ergste knelpunten in het aanvoertracé om water vanuit de zuivering Evertstekoog in de richting van Den Hoorn te leiden opgelost. In dit projectplan staat een omschrijving van de werkzaamheden en een beschrijving van de maatregelen en onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde de benodigde werken op een goede wijze te kunnen uitvoeren.

1.1 Huidige situatie

Voor de verdeling van het effluentwater van de zuivering Evertstekoog is een wateraanvoersysteem van primaire watergangen beschikbaar. Een deel van dit systeem is erg krap bemeten, waardoor een goede verdeling van het water problemen oplevert. Een deel van het te krappe tracé ten westen van Den Burg is reeds verbreed in het kader van de watercompensatie voor de dijkversterking. Met de aanliggende eigenaar van het laatste deel van dit krappe tracé is overeenstemming om ook dit stuk te kunnen verbreden.

1.2 Gewenste situatie

De verbreding van het onderhavige tracé maakt een betere verdeling van water en onderhoud binnen de onderhoudscycli van het hoogheemraadschap van de waterloop mogelijk.

2 Voorgenomen werkzaamheden


2.1 Ligging en begrenzing van het projectgebied

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarop het Projectplan betrekking heeft en betreft een deel van de polder Gemeenschappelijke Polders, nabij de Laanweg in Den Burg.

Projectgebied

Het projectgebied is het gebied waar daadwerkelijk de voor de aanleg van de compensatie benodigde maatregelen (werkzaamheden) plaatsvinden. Het projectgebied bevindt zich binnen het plangebied. De locatie ligt centraal in het projectgebied.

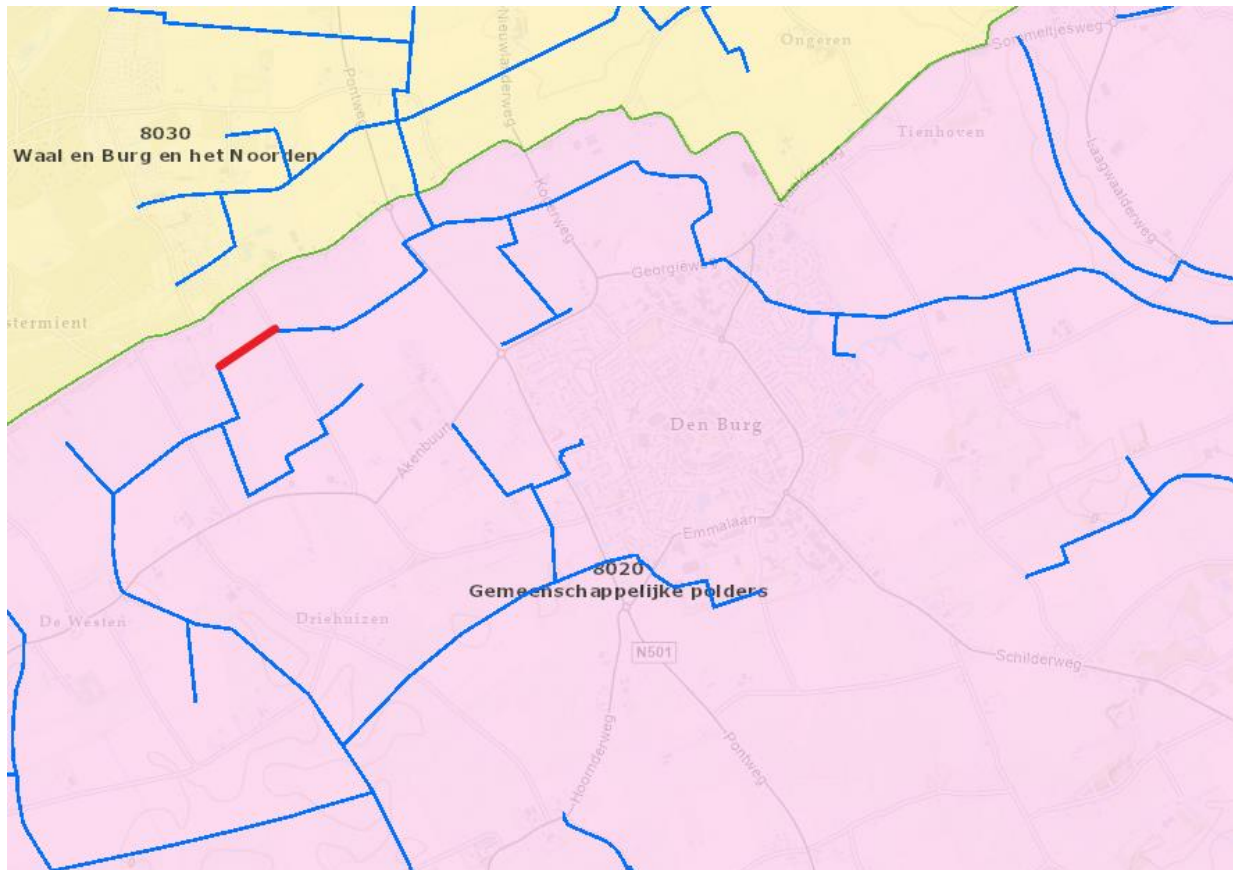

Figuur 1: Plangebied en projectgebied watercompensatie

2.2 Uit te voeren werken.

Het totaal van de werken bestaat uit het verbreden van een watergang over een lengte van circa 260 m1. Ter verbetering van de interne waterbeheersing van de aanliggende percelen wordt een deel van de uitkomende grond verwerkt in twee aan te brengen dammen voorzien van duikers ($\varnothing$ 200 mm) met een uitstroombakje met schotbalken



Figuur 2: Uit te voeren werken


2.3 Maatvoering

In figuur 2 zijn enkele, zoveel mogelijk representatieve, profielen opgenomen van de verbreding van de watergangen. Deze profielen geven aan de te verbreden watergangen op deze locatie. Vanwege de praktische uitvoerbaarheid, en de grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden zijn kleine afwijkingen van de in het projectplan opgenomen profielen mogelijk. Alle watergangen worden verbreed aan één zijde (B-zijde). Daarbij wordt het talud te allen tijde 1:1.5 en de verbreding staat aangegeven in tabel 3.




Figuur 3: locatie van de profielen

PRO-JG-006-560_OEVER_AH* (5-7-2012)

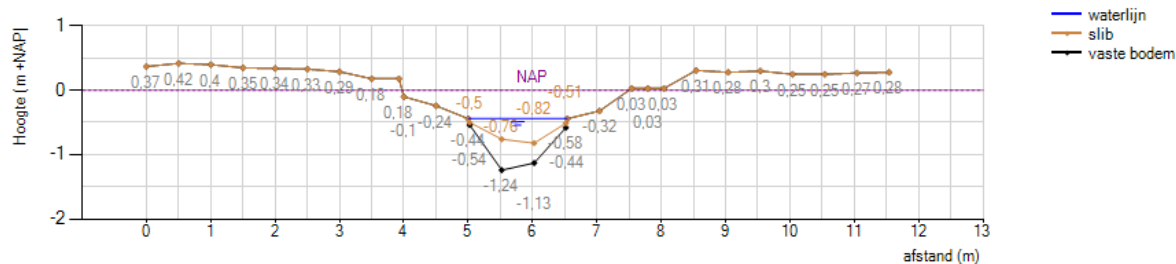

Figuur 4: huidig profiel 560

PRO-JG-006-561_OEVER_AH* (5-7-2012)

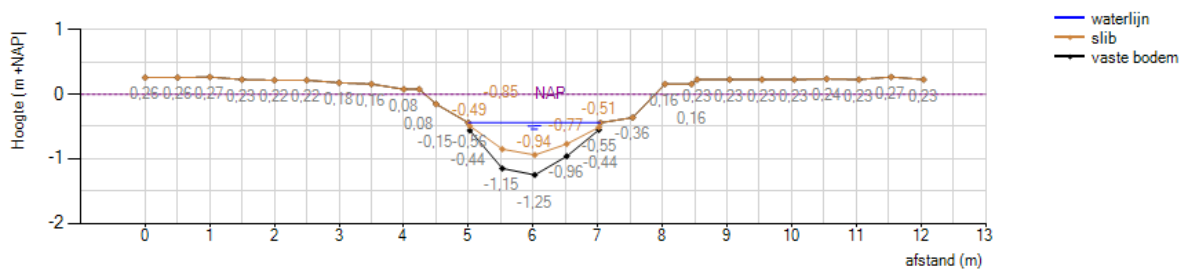

Figuur 5: huidig profiel 561



waterloop		lengte	oude situatie		nieuwe situatie		verbreding		M2
			breedte op waterlijn	breedte op insteek	breedte op waterlijn	breedte op insteek	op waterlijn (m)	op insteek (m)	
OAF-Q-34883	primair	111	2,50	4,00	3,50	5,30	1,00	1,30	111,00
OAF-Q-34883	primair	50	2,50	4,00	3,50	5,30	1,00	1,30	50,00
OAF-Q-35061	primair	146	2,25	4,00	3,50	5,30	1,25	1,30	182,50
OAF-Q1-15592	primair	63	2,25	4,00	3,50	5,30	1,25	1,30	78,75
OAF-Q1-15591	primair	98	2,25	3,50	3,50	5,30	1,25	1,80	122,50
OAF-Q1-15590	primair	140	2,25	3,50	3,50	5,30	1,25	1,80	175,00
OAF-Q1-15589	primair								
OAF-Q1-15588	primair	240	3,00	5,00	3,50	5,30	0,50	0,30	120,00

Tabel 1: Wijziging in afmetingen per te vergraven watergang voor en na uitvoering.


De afmetingen van de nieuw te graven watergang zijn:

Talud: 1:1,5

Bodemhoogte NAP -1,10 meter


Breedte op waterlijn: 3,50 meter

PRO-JG-006-560_OEVER_AH* (5-7-2012)

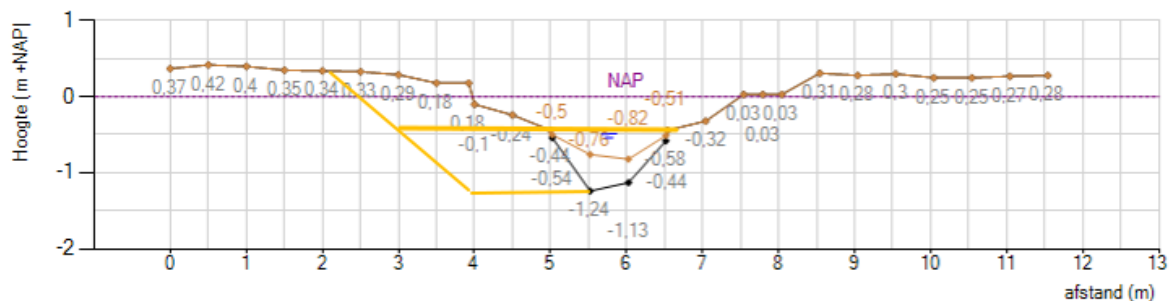

Figuur 8: nieuw profiel 560

PRO-JG-006-561_OEVER_AH* (5-7-2012)

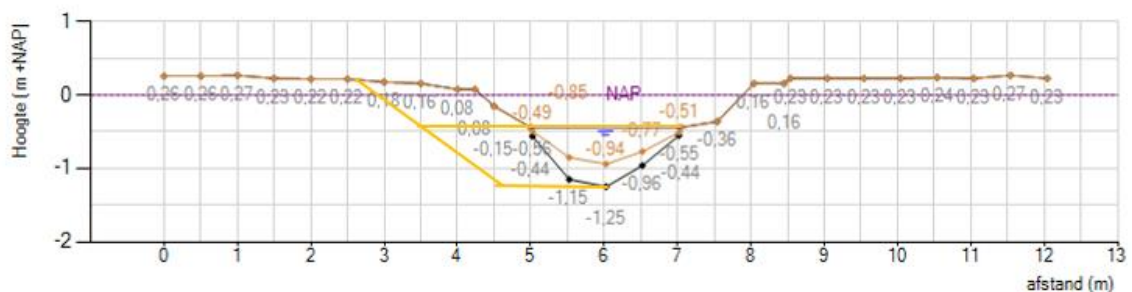

Figuur 9: nieuw profiel 561



2.4 Effecten op de omgeving

In dit hoofdstuk worden de effecten van de verbreding van de primaire waterloop beschreven. De effecten zijn zowel voor de gebruiks- als de uitvoeringsfase bepaald. De gebruiksfase betreft de situatie na de uitvoering van de verbreding. Tijdens de uitvoering worden de uitvoeringseffecten gemonitord. Op deze manier kunnen, indien nodig, tijdig (aanvullende) maatregelen worden getroffen om de effecten te verminderen of te voorkomen.

De realisatie van de slootverbreding is vergunbaar en uitvoerbaar indien de noodzakelijke mitigerende en compenserende maatregelen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden getroffen. De effecten en de omgevingsaspecten zijn beoordeeld, maar zijn niet van betekenis voor dit project:

- Wonen en werken: In de directe nabijheid van het werk liggen geen woningen die hinder ondervinden van de uitvoering van het werk.
- Verkeer en bereikbaarheid: Er wordt geen gebruik gemaakt van de openbare weg, omdat de uitkomende grond verwerkt wordt in dammen en op de aanliggende percelen. De effecten op verkeer en bereikbaarheid zijn daardoor verwaarloosbaar.
- Veiligheid: De uit te voeren werkzaamheden gebeuren allemaal op landbouwgrond. De werkzaamheden worden uitgevoerd door erkende loonwerkers. De effecten op de veiligheid zijn daarom verwaarloosbaar.
- Recreatie en toerisme: De werkzaamheden vinden niet plaats op belangrijke locaties of routes voor recreatie of toerisme. De effecten op recreatie en toerisme zijn er daarom niet.
- Licht, geluid, luchtkwaliteit en trillingen: enkel geluid is relevant omdat de waterloop die wordt aangepast gedeeltelijk in een stiltegebied ligt. Aangezien het werk binnen de vrijstellingen valt van de Provinciale Milieuverordening hoeft er geen ontheffing PMV aangevraagd te worden.
- Ontwikkelingen in de directe omgeving

In onderstaande paragrafen volgen de relevantie omgevingsaspecten.

2.4.1 Belanghebbenden

Agrariërs

De realisatie van het grotere doorstroomprofiel heeft een positief effect op de waterbeheersing van het omliggende gebied. Na realisatie van de maatregelen zit er meer ruimte in het watersysteem en is de kans minder groot dat percelen van omwonenden worden geconfronteerd met wateroverlast. Ook is de aanvoer van water in de richting van Den Hoorn beter te realiseren.

De eigenaar van de direct aanliggende is zelf gekomen met het voorstel dan HHNK de waterloop verbreedt. De benodigde grondoppervlakte hoeft niet te worden aangekocht. Er zijn afspraken gemaakt over de verwerking van de uitkomende grond.

Bewoners

In de nabijheid van de locatie waar de watercompensatie gerealiseerd wordt liggen geen woningen.

2.4.2 Natuur

Ter voorbereiding aan de werken is een Quickscan uitgevoerd voor het te vergraven deel van de primaire waterloop. Onderstaand zijn de conclusies uit de Quickscan samengevat.



De nemen ingreep zal een geringe verstoring geven die geen negatieve invloed zal hebben op het nabij gelegen N2000 gebied Nationaal Park Duinen van Texel.

Soortbescherming met betrekking tot Vleermuizen

Effecten door het verbreden van watergang op verblijfplaatsen, foerageer of vliegroute zijn uitgesloten. De werkzaamheden zullen geen effect hebben op vleermuizen die mogelijk foerageren in het plangebied. Verdere verstoring wordt voorkomen door de werkzaamheden uit te voeren tussen zonsopgang en zonsondergang. Bomen worden niet gekapt tijdens werkzaamheden.

Soortenbescherming met betrekking tot Rugstreeppad

Effecten door het verbreden van watergang op verblijfplaatsen zijn uitgesloten wel, gezien de werkzaamheden in het najaar, bestaat de mogelijkheid dat Rugstreeppadden op zoek naar winterverblijven het projectgebied in kunnen trekken. Wanneer hier sprake van aanwezigheid is van Rugstreeppad zal het nodig zijn een faunaraster aan te brengen.

Soortenbescherming met betrekking tot Waterspitsmuis en Noordse woelmuis

Genoemde soorten of nesten of verblijfplaatsen zijn tijdens inventarisatie niet aangetroffen en effecten op instandhouding van de waterspitsmuis als ook de Noordse woelmuis zijn dan ook uitgesloten. Wel zal HHNK zoals besproken zorg dragen dat het gehele plangebied vanaf Laanweg gemaaid zal worden. Zowel oevers aan beide zijde van watergang als ook het aanwezige riet in watergang zal tot uitvoering verbreden watergang periodiek gemaaid dienen te worden. Deze maatregel met betrekking op maaien van plangebied zorgt ervoor dat de gehele watergang ongeschikt zal blijven voor Waterspitsmuis en Noordse woelmuis.

Overige Zoogdieren

Van overige landzoogdieren zoals muizen, Bruine rat, egel, Haas en konijn zijn deze in kleine aantallen te verwachten. Naast de algemene zorgplicht hebben de soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

Vissen

Effecten op vissen worden uitgesloten wanneer men zorg draagt in uitvoering deze niet ingesloten worden tijdens graafwerkzaamheden aan de watergang.

Vogels

Door uitvoering van de werkzaamheden overdag plaats vinden buiten broedseizoenen zullen er geen negatieve effecten op vogels of slaapplekken of nesten zijn.

Ontheffing Wet Natuurbescherming.

Voor geplande werkzaamheden in plangebied het, vergraven van watergang nabij Laanweg is geen ontheffing Wet Natuurbescherming ten aanzien van soortenbescherming nodig.

Effectenbeoordeling N2000 Nationaal Park Duinen van Texel.

Gezien de bestemming van Plangebied (agrarisch gebied) jaard van werkzaamheden, periode van uitvoering werkzaamheden en gedaan onderzoek naar soortenbescherming en habitat bescherming is geen ontheffing nodig en, zal er geen negatief effect zijn op het Nationaal Park Duinen van Texel.



2.4.3 Water

De Waterwet eist dat de aanleg of de wijziging van een waterstaatswerk gebeurt volgens een door het hoogheemraadschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit waartegen rechtsbescherming open staat.

De uitvoering van dit projectplan levert een bijdrage aan het realiseren van de volgende doelen/thema's uit het Waterbeheerplan : droge voeten en voldoende water. Dit projectplan zorgt er namelijk voor dat water aan- en afvoer verbeterd, opdat het functioneren en het gebruik van het watersysteem zijn gegarandeerd.

Effecten en maatregelen

Het verbreden van watergangen heeft geen effecten op het oppervlaktewater. Tijdens de uitvoering zal het water tijdelijk meer vertroebelen, maar dit leidt niet tot negatieve effecten op de waterkwaliteit. Nadelige gevolgen voor de waterhuishouding zijn niet aan de orde. Het watersysteem op Texel kan door de realisatie van watercompensatie blijven functioneren zoals nu het geval is.

2.4.4 Bodem

Grond

Bij navraag bij de gemeente blijkt de uitkomende grond te kunnen worden verwerkt op naastliggende percelen, conform het gestelde in de bodemkwaliteitskaart voor onverdachte locaties binnen het landbouwgebied. Grondverzet is daarom mogelijk op basis van de bodemkwaliteitskaart en/of op basis van de 'op-en-nabij-regeling' uit het Besluit bodemkwaliteit. Volgens deze regeling mag grond op of nabij de locatie van herkomst worden hergebruikt onder dezelfde condities en zonder tussentijdse bewerking.

2.4.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Landschap

Het toetsingskader voor het landschap bestaat onder andere uit het bestemmingsplan Buitengebied Texel en het daarbij behorende Beeldkwaliteitsplan. Met de Beeldkwaliteitsplan wil de gemeente de karakteristieke landschappen buiten de bebouwde kom beschermen.

Effecten en maatregelen

De realisatie van watercompensatie zorgt voor verbreding en verlenging van bestaande watergangen welke gelegen zijn in het open landschap van Texel. Door bestaande watergangen te verbreden en verlengen en geen nieuwe wateren toe te voegen aan het landschap heeft de realisatie van de watercompensatie geen negatief effect op het landschap. De werkzaamheden binnen dit projectplan hebben geen negatief effect op het landschap, omdat de bestaande watergangen al deel uitmaken van het landschap op Texel.

Cultuurhistorie en monumenten

De Erfgoedwet (voorheen: monumentenwet) regelt de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Deze monumenten betreffen onder meer gebouwen en archeologische monumenten, zowel onder als boven water. Voor het wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen van een beschermd monument is een vergunning nodig. De provinciale milieuverordening (PMV) regelt de bescherming van het aardkundig monument Oude Land van Texel.

Effecten en maatregelen

Effecten op monumenten door de realisatie van watercompensatie zijn niet aan de orde. De werkzaamheden bestaan uit het graven en verbreden van bestaande watergangen. De verbreding



van watergangen tast de toplaag van het bodemprofiel en het microreliëf aan. De verbreding van de watergangen wordt maximaal 1,50 meter diep ten opzicht van het huidige maaiveld. De watergangen worden direct grenzend aan de huidige watergangen verbreed. Op de schaal van het aardkundig monument is deze aantasting minimaal van aard. Voor de werken binnen het aardkundig monument is ontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor het transport van materiaal ten behoeve van de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de aanwezige infrastructuur. De verwachting is dat transportbewegingen geen effect hebben op waardevolle aardkundige waarden.

Archeologie

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht om bij de planvorming rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Uitgangspunt daarbij is behoud van archeologische waarden 'in situ' (bij behoud in situ blijven de archeologische waarden in de bodem bewaard). Door middel van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Erfgoedwet (voorheen: monumentenwet) aangepast op het Verdrag van Malta. De wet legt beperkingen op ten aanzien van grondgebruik. In het archeologische beleidsplan van Texel worden voorschriften gegeven voor de diverse archeologische waarden en verwachtingen op het eiland.

Door Archeologie Westfriesland is de locatie beoordeeld op archeologische waarden.

Door middel van een mail is de ontgravingscontour van de sloten aan de Akenbuurt vrijgegeven. Wel ontvangt Archeologie Westfriesland graag tijdig een melding wanneer wordt gestart.

In de mail is het volgende geformuleerd:

Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk.

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren.

Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 5.10) eigendom van de Provincie Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland te Castricum.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (06304-68593). Archeologie West-Friesland krijgt ook de contactgegevens van de aannemer, zodat contact kan worden onderhouden over de voortgang.



2.4.6 Ontploffbare Oorlogsresten (OO)

In de omgeving van het onderzoeksgebied hebben er tijdens de opstand van de Georgiërs op Texel in 1945 gevechten en beschietingen plaatsgevonden. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen of er conventionele explosieven in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een werkprotocol om risico's van onverwacht aantreffen te beheersen. Dit werkprotocol "onverwacht aantreffen conventionele explosieven wordt gehanteerd indien er geen aantoonbaar verhoogd risico aanwezig is, aangezien de werkzaamheden worden uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrond risico aanwezig.

In het werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het spontaan aantreffen van een explosief. Tevens wordt geadviseerd een toolbox voor de aannemer te laten verzorgen. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt mogelijk stagnatie tijdens de werkzaamheden en verkleint daarmee financiële risico's.

2.4.7 Kabels en leidingen

Een juridisch beoordelingskader is voor dit thema niet aanwezig. Hierdoor wordt direct ingegaan op de effecten en maatregelen.

Effecten en maatregelen

Door middel van een KLIC-melding is de ligging van de aanwezige kabels en leidingen in beeld gebracht.

Een beheerder of eigenaar die zijn kabel of leiding moet aanpassen vanwege het projectplan, kan het hoogheemraadschap, zodra het projectplan is vastgesteld, om nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie HHNK 2010 verklaart de NKL 1999 van overeenkomstige toepassing op deze verzoeken.



2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering

Deze paragraaf gaat in op de mogelijke wijze van uitvoering van de slootverbreding. Zowel de precieze wijze van uitvoering als de fasering van de uit te voeren werkzaamheden worden overgelaten aan de opdrachtnemer (aannemer) die de werken gaat realiseren. De opdrachtnemer dient hierbij de voorwaarden die volgen uit onder andere het contract met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dit projectplan, de bijbehorende planproducten en de vergunningen in acht te nemen.

Planning en fasering

De uitvoering vindt plaats in het najaar van 2021.

2.5.1 Beschikbaarheid van de benodigde grond

Voor het gehele ruimtebeslag voor het verbreden van de watergangen wordt overleg gevoerd met de aanliggende eigenaar.

2.5.2 Vergunningen

In de bestemmingsplannen van de gemeente Texel is de verplichting opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken nodig is voor onder andere het verbreden van watergangen en graafwerkzaamheden. Voor de uitvoering van de werken is derhalve een omgevingsvergunning uitvoeren van werken noodzakelijk. De aanleg van water(berging) past overigens binnen de bestemmingsomschrijving in de voor de betrokken locatie geldende bestemmingplannen zodat dit projectplan planologisch inpasbaar is.

2.6 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering

Inherente afwijkingsmogelijkheden

In paragraaf 2.2 en bijlage 6 staan de afbeeldingen en de afmetingen van de watergangen die we gaan wijzigen. Deze maten en de afbeeldingen zijn bepalend voor de wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd. Desondanks is niet uit te sluiten dat in de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de hierboven beschreven maatvoering. Dit is inherent aan de aard van de waterstaatswerken voorkomend uit de praktische en de noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden en –machines.

Nadere invulling bij omgevingsvergunning

Dit projectplan geeft primair duidelijkheid over de functionele eisen van de watergangen die het hoogheemraadschap gaat vergraven. Daarnaast wordt het maximale ruimtebeslag en de maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Voor het vergraven van sommige watergangen geldt echter dat naast dit plan nog een omgevingsvergunning (bouwvergunning, aanlegvergunning, kapvergunning) nodig is. In dat geval kan de genoemde uitvoeringsvergunning nadere invulling geven aan de uiteindelijke constructie, de afmeting en het uiterlijk van het waterstaatswerk.



2.7 Beheer en onderhoud

Op het moment dat dit projectplan is uitgevoerd, zal het hoogheemraadschap de gerealiseerde werken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele eisen in de legger vastgelegd. Hiervoor neemt het hoogheemraadschap een leggerbesluit.

Het beheer en het onderhoud wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn. Ondanks dat de breedte van de watergangen vergroot wordt zal er niets veranderen aan het beheer en onderhoud. De primaire waterloop is en blijft in onderhoud bij het hoogheemraadschap (m.u.v. de droge oever).

2.8 Schade en nadeelcompensatie

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit project voor omwonenden of bedrijven. Er worden maatregelen genomen om schade of hinder zoveel mogelijk te beperken. Desondanks zou schade kunnen ontstaan. In deze paragraaf is aangegeven hoe met schade wordt omgegaan.

Nadeelcompensatie

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade lijdt, kan zij bij het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het hoogheemraadschap keert een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de indiener moet komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die binnen het normaal maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een belanghebbende kan zijn verzoek indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat hij heeft vastgesteld dat hij in een wezenlijk nadeliger positie is komen te verkeren door de uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de Verordening nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap toe. Ook een beheerder of eigenaar die zijn kabel of leiding moet aanpassen vanwege het projectplan, kan het hoogheemraadschap om nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap verklaart de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatwerken en Spoorwerken 1999 van overeenkomstige toepassing op deze verzoeken.

Uitvoeringsschade

Tijdens de realisatie van de versterking kan sprake zijn van niet voorziene situaties waarbij als gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de eigendommen van derden (doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en dergelijke). Als deze schade onverhoopt optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te schrijven, kan het hoogheemraadschap de eigenaar/gebruiker schadeloos stellen.


2.9 Rechtsbescherming

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan een waterstaatswerk dient de waterbeheerder een projectplan op te stellen. Het hoogheemraadschap is als beheerder van het watersysteem het bevoegd gezag dat het projectplan vaststelt.



Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is meegenomen. De inspraakverordening van HHNK stelt dat voor een projectplan met betrekking tot een waterstaatswerk inspraak wordt verleend overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat eerst de mogelijkheid wordt geboden gedurende zes weken de stukken in te zien en de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen. Na de bestuurlijke vaststelling is er beroep mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het projectplan is op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet genoemd in de bijlage bij artikel 1.1 van de Crisis- en Herstelwet. Dit betekent dat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet op het projectplan van toepassing zijn. In afdeling 2 zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de voorbereiding van besluiten, de beperking van beroepsrecht, het passeren van gebreken, beroep en hoger beroep en vernietiging van besluiten.

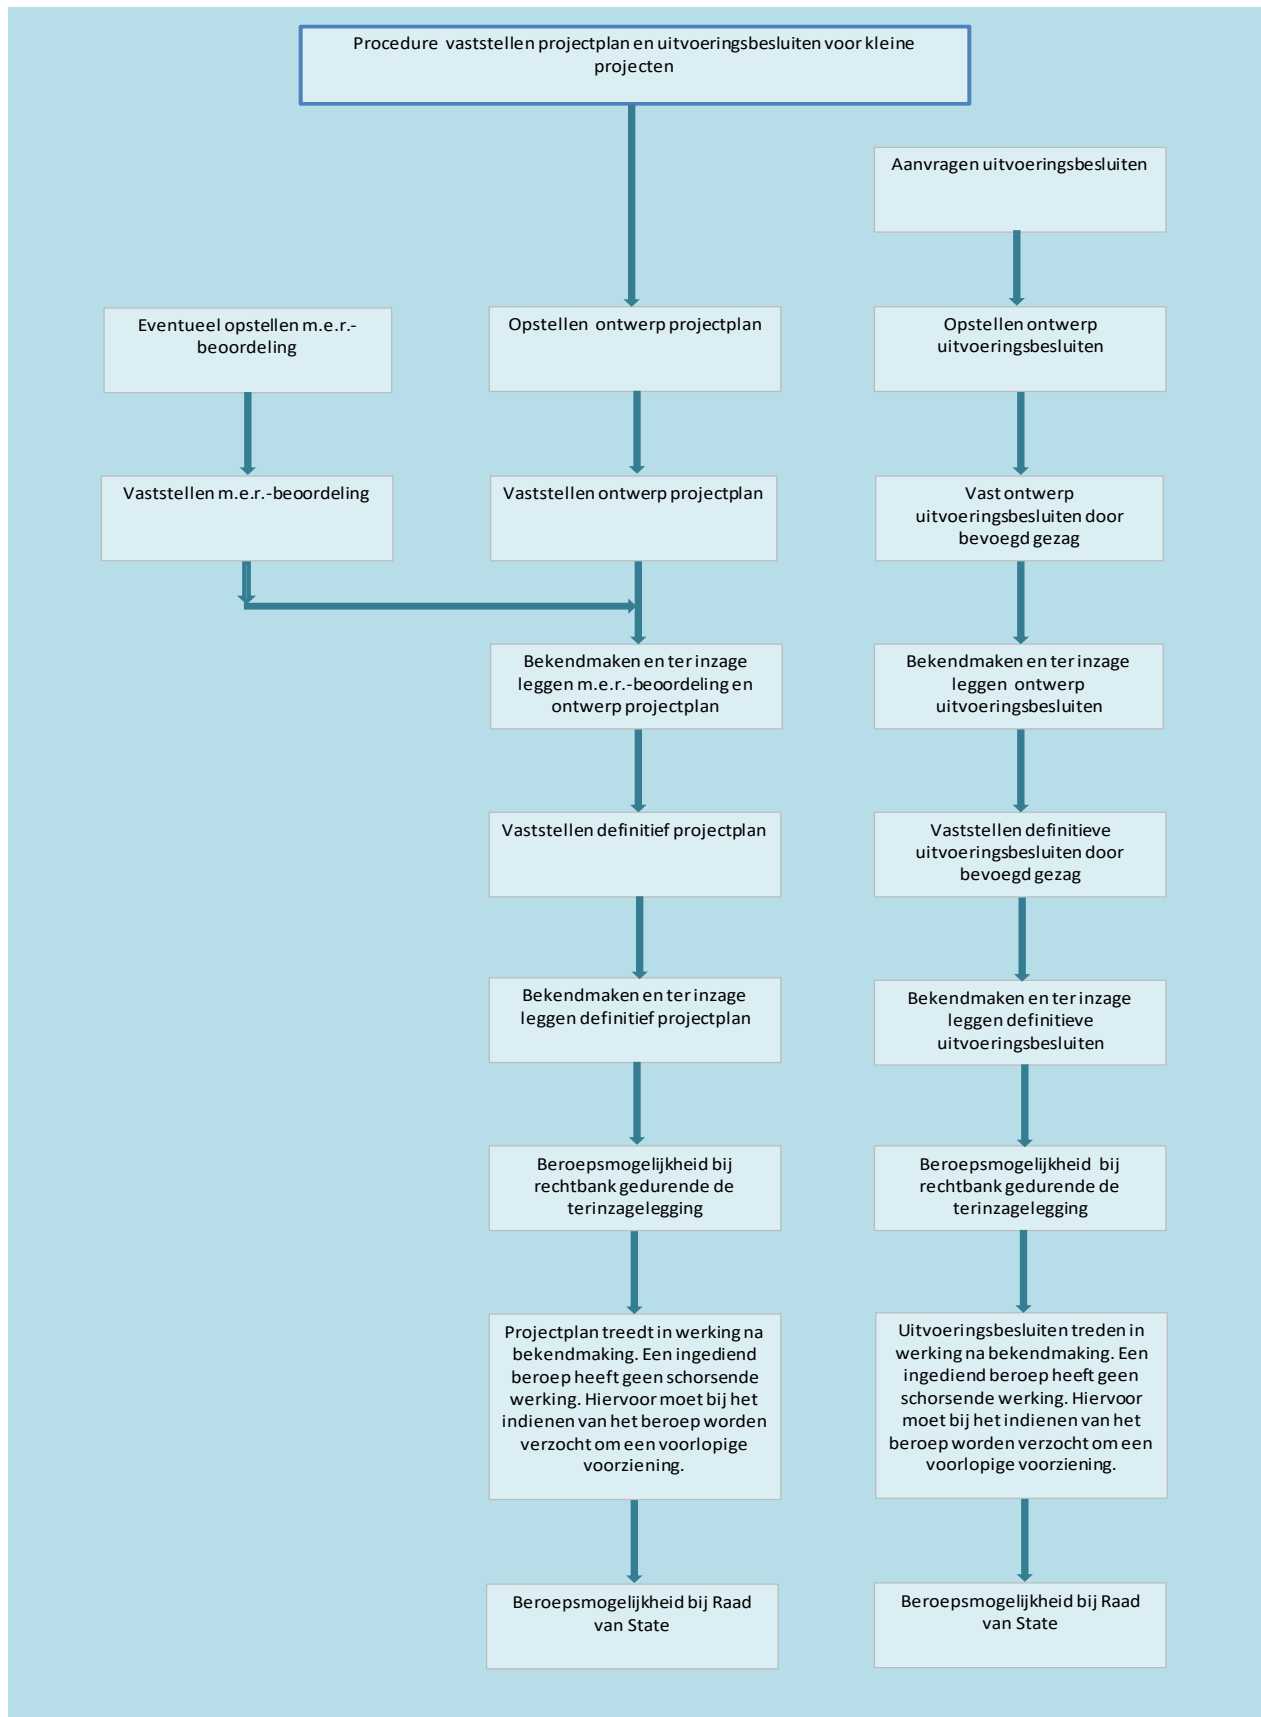



3 Bijlagen

1.1 Bijlage 1. Quicksan Wet Natuurbescherming

Corsa: 21.0964910

1.2 Bijlage 4. Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Corsa:

1.3 Bijlage 5. Archeologie

Corsa:
