

9. Verplichtingen

9.1 Besteksverplichtingen

Het bestek tekent onder 0. Totstandkoming overeenkomst 0.04 dat Rutte Wegenbouw in het bezit moet zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001.

Voor het uitvoeren van milieutechnisch grondwerk dient Rutte of diens onderaannemer BRL 7000-7001 gecertificeerd te zijn.

Het bestek tekent onder 1. Algemeen 1.07 op dat het werk volgens de Standaard RAW bepalingen Standaard 2005 onder kwaliteitsborging volgens het bepaalde uit de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 moeten worden uitgevoerd.

Het bestek tekent onder 2.1. Algemene gegevens 07 Milieuhygiënische gegevens op dat de vrijgekomen grond, verhardings- en/of funderingsmaterialen per deelopdracht worden vermeld.

De veiligheidsklasse van verontreinigde grond zal worden vastgesteld volgens de geldende CROW publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, als bedoeld in artikel 17.02.01 RAW 2005.

Het bestek tekent onder 2.1. Algemene gegevens 08 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan de volgende stoppunten op.

1. Het plaatsen van de buitenbak. Onderbak dient stabiel, loodrecht en exact waterpas te worden gesteld
2. Het stellen van de veiligheidsvloer
3. Het monteren van de binnenbak
4. Huis-/ kolkaansluitingen indien twee tegenover elkaar geplaatste kolken zijn aangesloten op dezelfde spruit, dan dient de aansluiting te geschieden met behulp van een dubbele Y-stuk 45°, 3 x mof / 1 x spie.

De aannemer overhandigt tevens alle resultaten van de uitgevoerde bedrijfscontroles aan de directie.

Deel 2.2

Bestekspost	Omschrijving
[redacted] e.v.	Bij toepassing van bronbemaling, gegevens van de debietmeting, vorige dag, dagelijks overhandigen aan de directie voor 10.00uur.

[redacted] Richtlijn veilig graven CROW-publicatie 250 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

[redacted] Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Verdichtingsgraad artikel 22.02.06 lid 05 RAW 2005.

[redacted] Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen landbodem, 3T en 0F. 3 T is de zwaarste klasse in toxiciteit of giftigheid. 0 F drukt de ontvlambaarheid. Opdrachtgever geeft hiermee aan dat er geen ontvlambare stoffen zich bevinden in de ondergrond. Anders uitgedrukt geen benzineachtige stoffen.

Deel 3

01.13.05

Aannemer stelt de directie twee werkdagen van tevoren in kennis van een stoppunt of bijwoonpunt. Aangezien onder 2.1 er sprake is van stoppunten neemt Rutte aan dat het betrekking heeft op stoppunten.

9.2 Niet in bestek omschreven verplichtingen

Verontreinigde grond.

In het bestek is opgenomen, 260110, dat er sprake kan zijn van verontreinigde grond. Het is dan mogelijk dat er sprake kan zijn van kabels en leidingen in de verontreinigde grond. In het verlengde van de toepassing verklaarde publicatie CROW 132 dient de publicatie CROW 307 van toepassing te zijn verklaard. Deze publicatie heeft als doel, de initiatiefnemers, uitvoerende partijen, adviseurs en toetsende overheden voorafgaand aan hun werkzaamheden inzicht te laten verkrijgen over de plaatselijke bodemkwaliteit en ze hiernaar te laten handelen.

In het verlengde daarvan dient de het Arbo –informatieblad 22 Werken in verontreinigde grond en/of grondwater van toepassing te worden verklaard.

Onverwacht tegenkomen van verontreinigde grond bij werkzaamheden.

Werkzaamheden direct staken en uitvoerder inschakelen. Uitvoerder dient direct de directie van het project in te schakelen. Direct de KAM-coördinator of de deskundige MVK HVK of arbeidshygiënist inschakelen. Van belang is dat onderzoek wordt uitgevoerd om te beoordelen of verontreinigingen aanwezig zijn en zo ja, in welke aard en mate. Wanneer dit bekend is moet het V&G plan aan de nieuw bekende gegevens worden aangepast. Pas dan kunnen de werkzaamheden worden hervat.

9.3 RAW bepalingen

10. Procesbeheersing

Volgens 01.20.02 lid 02 dient er een projectplanning te worden opgemaakt waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en de uitvoering aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderliggende relaties van de deelprocessen tot uiting komen.

In het bestek is bijgevoegd een planning. De planning is slechts een marginaal beeld van wat en waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Op dit moment is het dan ook niet mogelijk om voor iedere locatie dan wel iedere wijk een procesbeheersing op te tekenen.

In deze rapportage beperken wij ons dan door het benoemen van de kritische paden om tot plaatsing over te gaan.

- Verstrekken van de gegevens vanuit het Oriëntatieverzoek;
- Door de directie goed te keuren onderzoek ligging kabels en leidingen;
- Daar aan gekoppeld het vrij maken van de locatie voor onderzoek;
- Het beschikbaar stellen van autorisatie voor het uitvoeren van het onderzoek;
- De uitloop van het project met vertragingsschade doordat de onderzoeken niet mogelijk zijn;
- Het uitgeven van de directie van toestemming om een locatie vrij te geven voor uitvoering;
- Het door de directie beschikbaar stellen van ter beschikking stellen van materialen;
- Omgevingsfactoren zoals de status van de directie omgeving in relatie met het uit te voeren werk;
- De stoppunten en de tijdspanne die de directie daarvoor neemt;
- De wijze van acteren van de opdrachtgever in relatie met een project volgens OMOP discipline en begeleiding daar van;
- Niet op tijd acteren van de directie bij dagmelding stoppunt;
- Willekeur van de audit controles van de directie.

Kwaliteitsplan dient te voldoen aan het gestelde onder 01.20.02 lid 02, datering en de ondertekening van de aannemer.

Acceptie kwaliteitsplan volgens 01.13.03.

Rutte Wegenbouw



Opdrachtgever, de directie



11. Bijlagen

Rutte Groep



F.01 Melding afwijking / verbetering			
Naam aanmelder	:		
Datum melding	:	Codering melding	:
Omschrijving van (potentiële) afwijking of (mogelijke) verbetering:			
Correctie afwijking:			
Afhandeling (potentiële) afwijking			
Naam behandelaar	:		
Kans op herhaling?	:	Ja/ Nee ¹	Bij Nee => geen verdere actie
Soort afwijking	:	Man/ Systeem ¹	Bij Man => instructie geven
Maatregel	:	Geen actie / actie / corrigerende maatregel / prev. maatregel ¹	
Voorstel corrigerende of preventieve maatregel:			
		Datum	Paraaf
Datum implementatie maatregel / instructie	:		
Datum controle maatregel / instructie	:		
Datum controle effectiviteit maatregel	:		
Datum terugkoppeling aan melder	:		
Afhandeling verbetervoorstel			
Naam behandelaar	:		
Kans op verbetering	:	Ja / Nee ¹	Bij Nee => geen verdere actie
Verbetervoorstel:			
		Datum	Paraaf
Datum implementatie verbetervoorstel	:		
Datum controle implementatie verbetervoorstel	:		
Datum controle effectiviteit verbetervoorstel	:		
Datum terugkoppeling aan melder	:		



Plan van Aanpak Kabels en Leidingen

**Project: Aanbrengen Ondergrondse Rest Afval
Containers in de Gemeente Den Haag**

Bestek:

Hoofdstuk 1 Aanleiding

De aanleiding voor het plan van aanpak is de onderzoeksvraag naar de ligging van kabels en leidingen.

Hoofdstuk 2 Doelstelling

De vraag is, waar liggen de kabels en leidingen met als doel om te bepalen of er een ondergrondse restafval container kan worden geplaatst op de betreffende locatie.

Hoofdstuk 3 Opdracht

Onze opdracht bestaat uit het onderzoeken naar de werkelijke ligging van kabels en leidingen.

Hoofdstuk 4 Opdrachtgever

Onze opdrachtgever is de gemeente Den Haag, deze wordt vertegenwoordigd door [REDACTED] projectleider. Daarnaast fungeren de [REDACTED] als directievoerder.

Hoofdstuk 5 Onze activiteiten

Op aanwijzing van de directie gaan wij over tot het uitvoeren van de volgende stappen. Dit op basis van de door de directie verstrekte locatie plaatsingstekening.

- Stap 1 na ontvangstverzoek tot onderzoek, over de betreffende locatie dan wel wijk, een graafmelding;
- Stap 2 72 uur voor aanvang werkzaamheden daadwerkelijk onderzoek locatie het plaatsen van parkeerverboden;
Het opnemen van kentekens en merk en de kleur van de geparkeerde auto's volgens protocol opdrachtgever;
- Stap 3 op de dag van uitvoering afzetten van de werklocatie middels bouwhekken;
Melding van stagnatie bij geparkeerde auto's;
Tijdregistratie stagnatie;
- Stap 4 het opnemen van de sleufbekleding;
- Stap 5 controle van de graafmelding, uitzetten van de kabels en leidingen vanuit die gegevens;
- Stap 6 aanvang met graafwerkzaamheden door zintuigelijk onderzoek, op basis van het gestelde in de CROW publicatie 132, vast te stellen verontreinigingen;
- Stap 7 grond ontgraven voor onderzoek ligging van kabels en leidingen. Als er een uitvraag is voor proefsleuven deze uitvoeren volgens de definitie vanuit de CROW publicatie 250. Waarin staat opgetekend: 1,00m ter weerszijden van de theoretische ligging met een maximum van 1,50m diepte. De theoretische ligging wordt bepaald aan de hand van de gegevens onder Stap 1.
- Stap 8 het inmeten van de gevonden kabels en leidingen aan bebouwing, aangemeten aan hoekpunten en vastgelegd middels foto's.
- Stap 9 grond ontgraven voor onderzoek ligging van kabels en leidingen. Als er een uitvraag is voor het lokaliseren van kabels en leidingen zonder opgave proefsleuven. Het uitvoeren van stap 7 om de betreffende kabel dan wel leiding te zoeken. Nadat de kabel dan wel leiding is gevonden deze volgen. Volgen is afhankelijk van de uitvraag tot plaatsing van ondergrondse containers. Vervolgens het uitvoeren van stap 8.
- Stap 9 observatie van de omgeving. Dat wil zeggen, het waarnemen van objecten, obstakels, boomwortels, lichtmasten, fietsnietjes, zoals ondergronds als bovengronds.
- Stap 10 na een controle op uitgevoerde werkzaamheden, gegevens opgeborgen, de ontgraven grond weer in lagen aanbrengen en verdichten.
- Stap 11 het aanbrengen van de sleufbedekking, afhankelijk van de opdracht deze afrillen en afstrooien met zand.
- Stap 12 het opruimen van de omgeving, bouwhekken laten afvoeren, dan wel verkeerszuilen verwijderen, parkeerverboden verwijderen.
- Stap 13 administratieve afwikkeling van het project.

Hoofdstuk 6 Afspraken

Wij maken per locatie afspraken van onze kosten.

Wij zetten daarvoor in:

GWW grondwerker eerste klas;

Vervoer;

Bebording;

Afzettingen, bouwhekken, verkeerszuilen;

Aansturing vanuit management;

Verwerking van gegevens werkvoorbereiding;

Materiaal;

Materieel.

Hoofdstuk 7 Basis van onze werkzaamheden

Opgetekend vanuit het bestek Deel 3 22 03 04.

22 03 04 RAPPORTAGE PROEFSLEUVEN

01 De aannemer dient per locatie binnen 2 werkdagen na aanbrengen sleufbedekking een gedetailleerde revisietekening, twee digitale overzichtsfotos van de 2 sleuven en een rapport, voorzien van de volgende gegevens bij de directie in te leveren:

- datum van graven proefsleuven;
- naam van aannemer en contactpersoon m.b.t. proefsleuven;
- materiaalsoort van de sleufbedekking;
- begin en einde van de beide proefsleuven dienen te worden gemaatvoerd t.o.v. harde topografie;
- aangetroffen grondsoorten en eventuele verontreinigingen (bijv. puin);
- diepte van eventueel aangetroffen grondwater;
- lengtemaatvoering van gevonden kabel(s) en/of leidingen t.o.v. bebouwing of harde topografie ;
- de materiaalsoort, kleur en diameter van de aangetroffen kabel(s) en/of leidingen;
- indien bekend (door aanwezigheid van waarschuwingslint, afdekplaten e.d.) soort kabel of leiding;
- de dekking op aangetroffen kabels- en leidingen i.v.m.

mogelijk half verdiepte containers;

- aanwezigheid van verbindingstukken in kabels en leidingen i.v.m. mogelijk half verdiepte containers;

- ingeschatte kroonprojectie van op tekening aangegeven bomen aangeven;

- de aanwezigheid van (trek)wortels;

- de aanwezigheid van eventuele overige obstakels zoals funderingsresten;

- indien proefsleuf niet of niet diep genoeg gegraven kan worden, de redenen daarvan vermelden;

- vermelding of container geplaatst kan worden.


Hoofdstuk 8 Samenvatting

Voor de betreffende vraag om de ligging van kabels en leidingen te onderzoeken voor de betreffende locatie xxxxxx voeren wij de omschreven werkzaamheden voor u uit voor een totaal bedrag van

Aldus opgemaakt,

Amsterdam 10 januari 2013

Rutte Wegenbouw

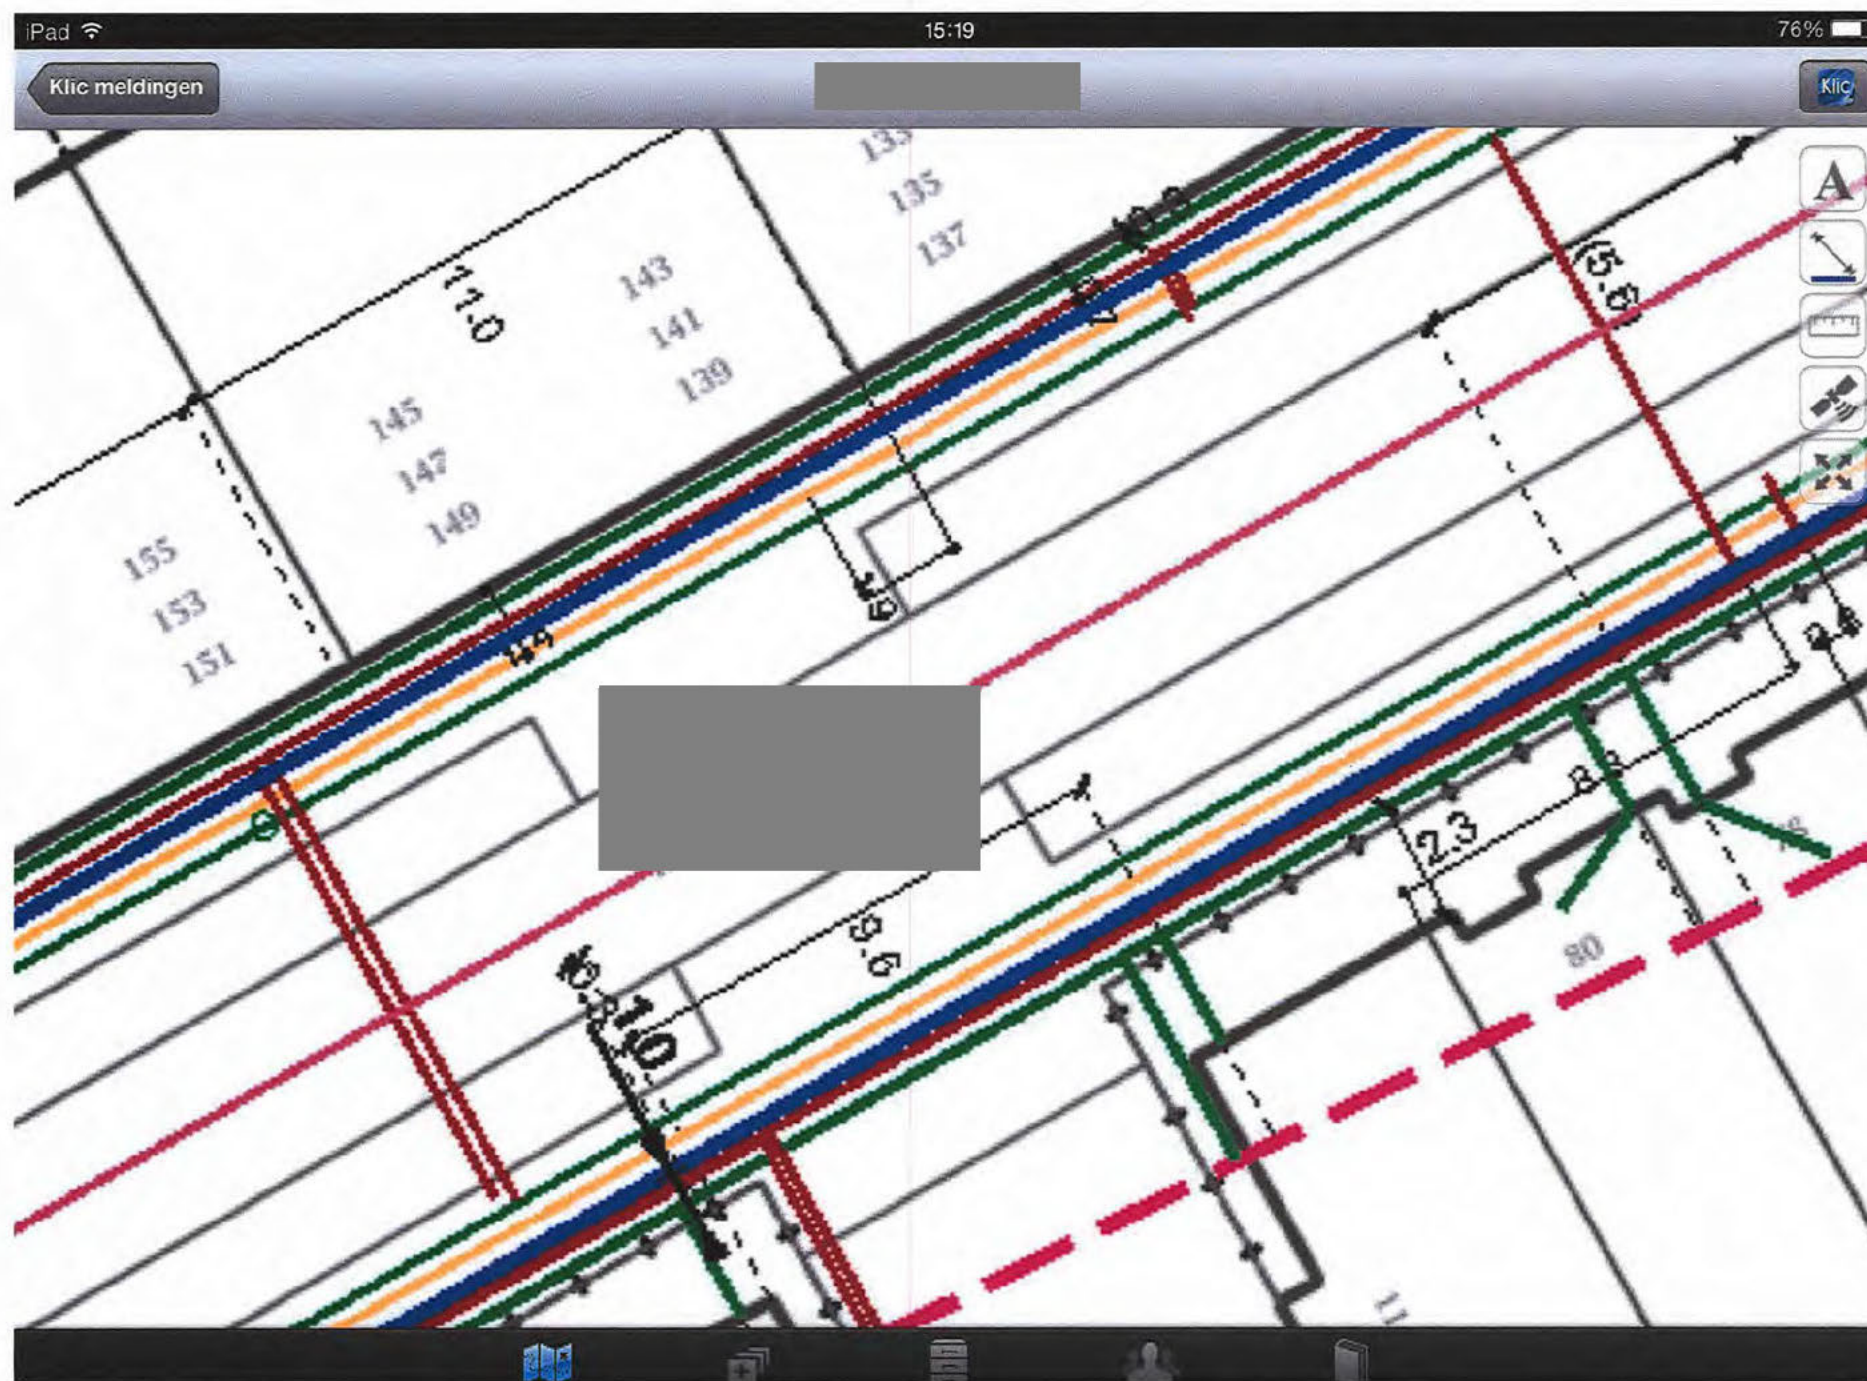

RVB [REDACTED]. Incident d.d. 10-11-2014. [REDACTED] Den haag bijlage 5 blad 1 van 1

datum	Verloop van het onderzoek
maandag 10 november 2014	incident vind plaats om ongeveer 11:45 uur
maandag 10 november 2014	graafmelding en ontvangsbevestiging van Kadaster ontvangen
dinsdag 11 november 2014	foto's gemaakt door SodM en ISZ&W
woensdag 12 november 2014	Rezel ter plaatse en fotos gemaakt
donderdag 13 november 2014	mail ontvangen van [REDACTED] nav telefoon gesprek
woensdag 3 december 2014	opnemen verklaring [REDACTED] bij Rutte in Amsterdam
donderdag 4 december 2014	Demonstratie plaatsing ORAC [REDACTED] at door Rutte
donderdag 4 december 2014	Rezel heeft foto's gemaakt van de demonstratie Nicolaistraat
dinsdag 16 december 2014	verzoek per mail aan Rutte om de op 3 december 2014 getoonde documenten aan te leveren
dinsdag 23 december 2014	usb stick ontvangen met daarop enkele gegevens. (datum is datum poststempel) dit is niet wat oorspronkelijk is toegezegd
donderdag 8 januari 2015	tweede verzoek mail verkeer en telefoon gesprek gegevens gevraagd. Optie vordering genoemd
vrijdag 30 januari 2015	mail met raambestek en overige niet relevante documenten ontvangen
maandag 26 januari 2015	vordering verstuurd naar Rutte
vrijdag 30 januari 2015	mail ontvangen van [REDACTED] waarin hij reageert gereageerd op de vordering
donderdag 5 februari 2015	telefoongesprek met de heer Vijn en afgesproken dat maandag 8 feb 2014 alles ontvangen zal zijn optie van rappel genoemd.
maandag 9 februari 2015	mail ontvangen nav vordering diverse rapportages ontvangen niet de gevraagde originele foto's en andere documenten
dinsdag 10 februari 2015	afpraak gemaakt [REDACTED] voor een overleg op 12 feb 2015 bij AT
donderdag 12 februari 2015	gesprek gehad met [REDACTED] en [REDACTED]
vrijdag 13 februari 2015	mail van [REDACTED] ontvangen met daarin de melding dat de arbeidsinspectie haar onderzoek staakt
woensdag 18 februari 2015	Via We Transfer de laatste gevraagde documenten ontvangen.
vrijdag 13 maart 2015	Verklaring opgenomen bij [REDACTED]
vrijdag 20 maart 2015	gebeld met [REDACTED] en gevraagd om zijn getekende verklaring. De verklaring komt na het weekend.
dinsdag 24 maart 2015	nogmaals gebeld met [REDACTED] en gevraagd om de verklaring deze komt met twee dagen
vrijdag 27 maart 2015	Met de [REDACTED] gesproken. [REDACTED] heeft zijn verklaring bij Rutte liggen en verwijst daarom naar Rutte.
vrijdag 27 maart 2015	Met [REDACTED] gesproken. [REDACTED] meldt mij dat hij het met de verklaring van [REDACTED] in deze vorm niet eens is. [REDACTED] meldt vervolgens dat hij de door mij toegestuurde vragen wel wil beantwoorden maar dat in een gesprek wil doen. Afspraak gemaakt met de [REDACTED] en [REDACTED] voor dinsdag 31 maart in Amersfoort. ook afgesproken dat beide heren een legitimatie meenemen. Gemeld dat het onderzoek richting opgaat van een overtreding van art 2 lid 2.
dinsdag 31 maart 2015	Overleg gehad met [REDACTED] en [REDACTED] Verklaring door Rutte is afgegeven en verwerkt in bijlage 11.



KLIC

Datum
29-10-2014 10:03

Onderwerp
Ontvangstbevestiging Graafmelding

Blad
1 van 4

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is:

Het ordernummer van de Klic-melding is:

De referentie van de Klic-melding is:

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Gegevens aanvrager

Naam
E-mailadres
Relatienummer
Bedrijf
Adres
Postcode / Plaats
Land
Telefoon
Datum aanvraag

NL

29-10-2014 10:03

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf
Naam
Adres
Postcode / Plaats
Land
Telefoon
E-mailadres
Fax

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden

30-10-2014

Aard graafwerkzaamheden

Bestratingswerk
Tanks/putten/containers in- of uitgraven
zie notities



Datum
29-10-2014 10:03

Onderwerp
Ontvangstbevestiging Graafmelding

Blad
2 van 4

Notitie Plaatsen ondergrondse afvalcontainers Contactpersoon [redacted]
[redacted]
Graafgebied
RD-coördinaten [(78223,454438), (77990,454305), (78043,454156), (78286,454275), (78223,454438)]
Dichtstbijzijnd adres [redacted] 's-Gravenhage
Huisaansluitschets voor de adressen [redacted] 's-Gravenhage

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Stedin B.V.	[redacted]	[redacted]			gas hoge druk hoogspanning datatransport gas lage druk laagspanning middenspanning
Gemeente Den Haag Dienst Stads	[redacted]				riool vrijverval
Colt Telecom BV	[redacted]				datatransport
Dunea	[redacted]				water
Eurofiber Nederland BV	[redacted]				datatransport
Gem Den Haag Stadsbeheer	[redacted]				laagspanning
HTM Personenvervoer NV	[redacted]				datatransport laagspanning middenspanning
KPN B.V.	[redacted]				datatransport
Reggefiber Operator B.V.	[redacted]				datatransport
Tele2 Nederland BV	[redacted]				datatransport
UPC NL BV	[redacted]				datatransport
VSTI Planontwikkeling	[redacted]				datatransport



Datum
29-10-2014 10:03

Onderwerp
Ontvangstbevestiging Graafmelding
[redacted]

Blad
3 van 4

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
VTSPN p/a Volker Wessels Telec	[redacted]t	[redacted]			datatransport
Ziggo BV	[redacted]				datatransport
bt Nederland N.V.	[redacted]				datatransport
Glaslokaal p/a VW Telecom Serv	[redacted]				overig





Datum
29-10-2014 10:03

Onderwerp
Ontvangstbevestiging Graafmelding

Blad
4 van 4

Grafische weergave van het gebied:

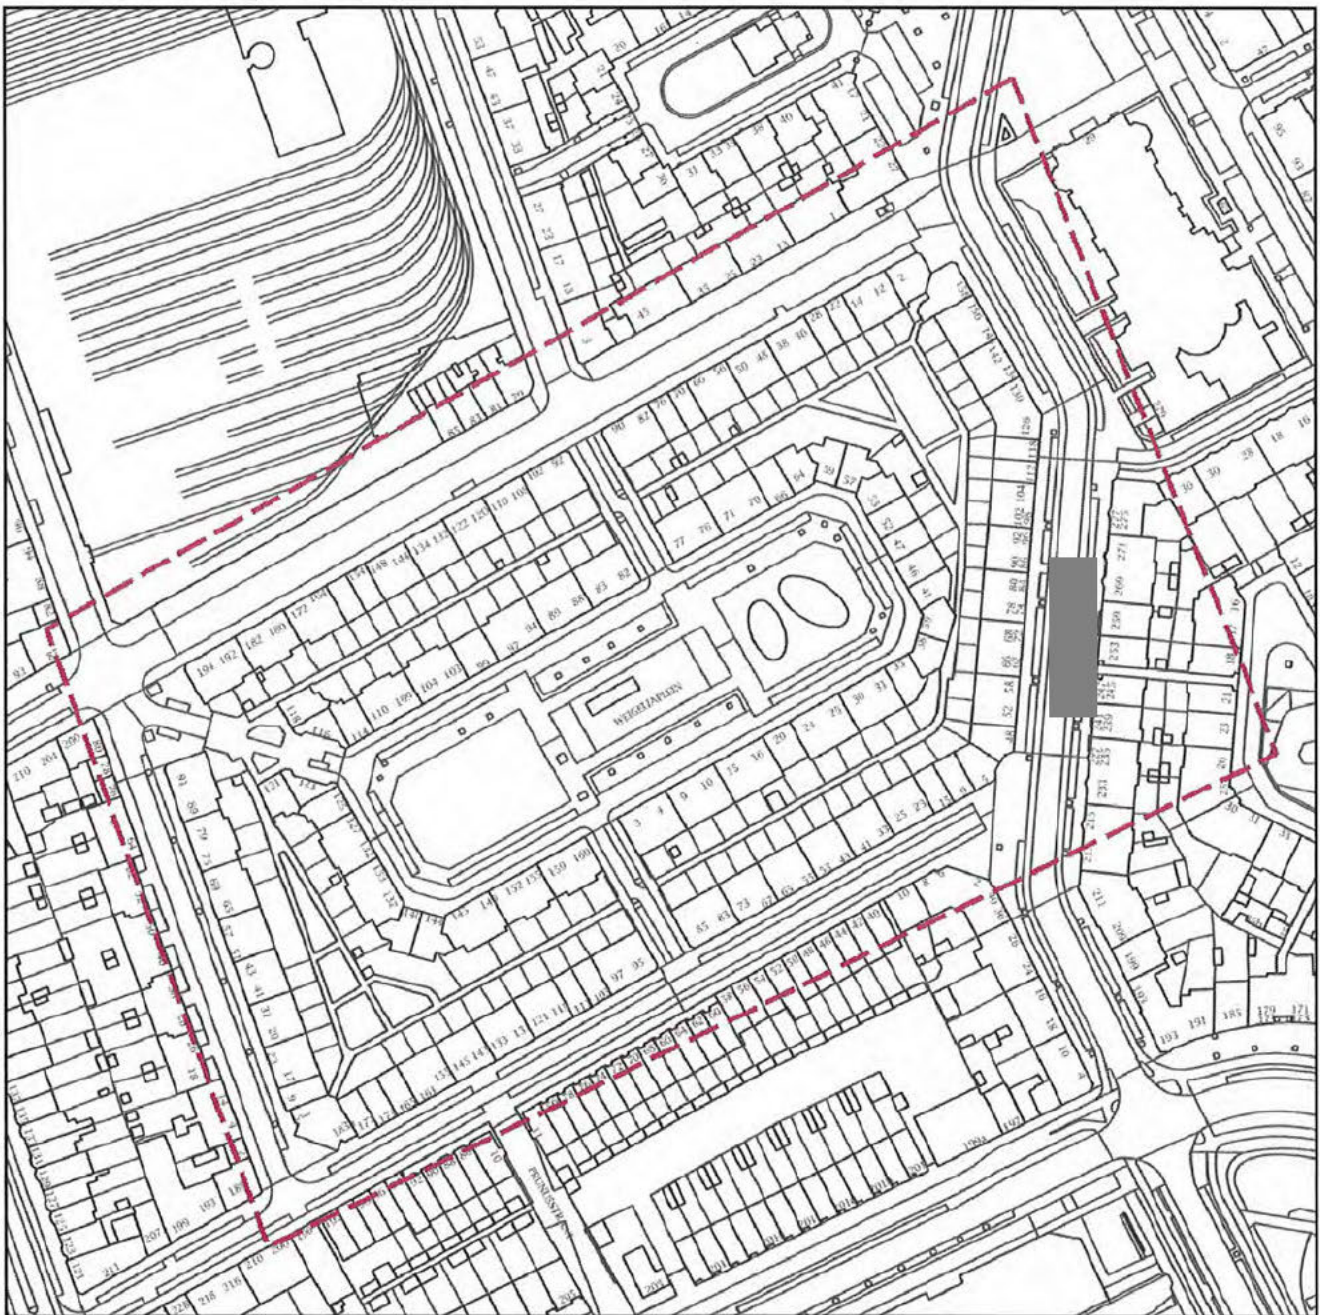

GEO
KLIC-ONLINE



Datum
29-10-2014

Onderwerp
Klic-melding [REDACTED]

Klantreferentie
[REDACTED]

Blad
1 van 5

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied.

Het meldnummer van de Klic-melding is: [REDACTED]

Het ordernummer van de Klic-melding is: [REDACTED]

De referentie van de Klic-melding is: [REDACTED]

De levering heeft de status: **Levering compleet - 29-10-2014 18:24**

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.
- Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het ordernummer meerdere ID's.

Dichtstbijzijnd adres

[REDACTED] s-Gravenhage



Datum
29-10-2014

Onderwerp
Klic-melding

Klantreferentie

Blad
2 van 5

Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
Stedin B.V.	laagspanning	Ja
Stedin B.V.	gas hoge druk	Ja
Stedin B.V.	gas lage druk	Ja
Stedin B.V.	hoogspanning	Ja
Stedin B.V.	datatransport	Ja
Stedin B.V.	middenspanning	Ja
HTM Personenvervoer NV		Alleen bijlage(n)
Colt Telecom BV	datatransport	Ja
Dunea	water	Ja
Eurofiber Nederland BV	datatransport	Ja
Gem Den Haag Stadsbeheer	laagspanning	Ja
Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer	riool vrijverval	Ja
KPN B.V.	datatransport	Ja
Reggefiber Operator B.V.		Alleen bijlage(n)
Tele2 Nederland BV	datatransport	Ja
UPC NL BV	datatransport	Ja
VSTI Planontwikkeling		Alleen bijlage(n)
VTSPN p/a Volker Wessels Telecom		Alleen bijlage(n)
Ziggo BV	datatransport	Ja
bt Nederland N.V.	datatransport	Ja
Glaslokaal p/a VW Telecom Services BV	datatransport	Ja

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

1.pdf
LI_1.xml
LG_gas+hoge+druk_stedin.png
MV_gas+hoge+druk_stedin.png



Datum
29-10-2014

Onderwerp
Klic-melding

Klantreferentie

Blad
3 van 5

AN_gas+hoge+druk_stedin_ .png
LG_hoogspanning_stedin_ .png
MV_hoogspanning_stedin_ 5.png
AN_hoogspanning_stedin_0 .png
LG_middenspanning_stedin_ .png
MV_middenspanning_stedin_ .png
AN_middenspanning_stedin_ .png
LG_datatransport_stedin_ .png
MV_datatransport_stedin_ .png
AN_datatransport_stedin_ .png
LG_gas+lage+druk_stedin_0 .png
MV_gas+lage+druk_stedin_ .png
AN_gas+lage+druk_stedin_ .png
LG_laagspanning_stedin_0 .png
MV_laagspanning_stedin_ .png
AN_laagspanning_stedin_ .png
BL_stedin_ +Klicbrief+GM+Stedin+(excl+rep+mantelschade).pdf
BL_stedin_ contactgegevens.pdf
ET_stedin_0 .png
BL_tabhtm_ voorwaarden+v2.pdf
BL_tabhtm_0 _Geen+belang+graaf.pdf
LG_datatransport_colt_ .png
MV_datatransport_colt_0 .png
AN_datatransport_colt_ .png
DK_datatransport_colt_0 _X-030-dwg.pdf
BL_colt_0 _brief.pdf
BL_colt_0 _voorwaarden.pdf
LG_water_dunea_ .png
MV_water_dunea_ .png
AN_water_dunea_0 .png
HA_water_dunea_ +PK_83.pdf
BL_dunea_ _Dunea_bijlage_brief_v2_2.pdf
ET_dunea_ .png
LG_datatransport_Eurofiber_ .png
MV_datatransport_Eurofiber_0 .png
AN_datatransport_Eurofiber_0 .png



Datum
29-10-2014

Onderwerp
Klic-

Klantreferentie

Blad
4 van 5

DK_datatransport_Eurofiber_Details.pdf
DK_datatransport_Eurofiber_9.pdf
TB_datatransport_Eurofiber_Standaard+voorwaarden+Eurofiber.pdf
BL_Eurofiber_0_Brief-Belang.pdf
LG_laagspanning_Gemeente+Den+Haag_.png
AN_laagspanning_Gemeente+Den+Haag_.png
BL_Gemeente+Den+Haag_Response.pdf
LG_riool+vrijverval_Dienst+Stadsbeheer_0_.png
AN_riool+vrijverval_Dienst+Stadsbeheer_.png
BL_Dienst+Stadsbeheer_0_Response.pdf
LG_datatransport_KPN_.png
MV_datatransport_KPN_5.png
AN_datatransport_KPN_.png
HA_datatransport_KPN_0_83.PDF
TB_datatransport_Waterkruisingen.PDF
BL_KPN_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0_.png
PT_KPN_0_5.png
BL_Reggefiber_00_Brief-GeenBelang.pdf
LG_datatransport_Tele2_.png
MV_datatransport_Tele2_.png
AN_datatransport_Tele2_.png
DK_datatransport_Tele2_Details.pdf
BL_Tele2_0_Brief-Belang.pdf
LG_datatransport_upc_.png
MV_datatransport_upc_5.png
AN_datatransport_upc_.png
BL_upc_brief.pdf
BL_upc_voorwaarden.pdf
BL_VW+Telecom_BriefGeenBelang.pdf
BL_VW+Telecom_BriefGeenBelang.pdf
LG_datatransport_Ziggo+BV_.png
MV_datatransport_Ziggo+BV_0_.png
AN_datatransport_Ziggo+BV_.png
TB_datatransport_Ziggo+BV_Regiobrief.pdf
PT_Ziggo+BV_.png

kadaster



Datum
29-10-2014

Onderwerp
Klic-melding [redacted]

Klantreferentie
[redacted]

Blad
5 van 5

LG_datatransport_BT+Nederland [redacted].png
 MV_datatransport_BT+Nederland [redacted].png
 AN_datatransport_BT+Nederland [redacted].png
 DK_datatransport_BT+Nederland [redacted].Details.pdf
 TB_datatransport_BT+Nederland [redacted].Voorwaarden+en+Richtlijnen+BT.pdf
 BL_BT+Nederland [redacted].Brief-Belang.pdf
 LG_datatransport_VW+Telecom [redacted].png
 AN_datatransport_VW+Telecom [redacted].png
 TB_datatransport_VW+Telecom [redacted].BriefAlgemeenMetOverzichtskaart.pdf
 [redacted].ng
 [redacted].png
 [redacted].pdf

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie	



Onderstaande contacten kunt u benaderen voor meer informatie over de door u voorgenomen werkzaamheden.

Klicnummer		
Netbeheerder	stedin	
Contactpersoon		
Toezichthouders		

Stedin Netbeheer B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam
tel 0900-1426 (lokaal tarief)
www.stedin.net
KvK Rotterdam 24289101

Bijlage Voorwaarden

Telefoon 088 895 62 22
Email klicdesk@stedin.net

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan. Graag reageren wij op deze melding.

Aanwezigheid kabels en leidingen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema's en specifieke onderwerpen aanwezig kunnen zijn van Stedin Netbeheer B.V., in het gebied dat u hebt opgegeven als graaflocatie.

De volgende thema's kunnen voorkomen:	Gas hoge druk, gas lage druk, hoogspanning, middenspanning, laagspanning en datatransport.
Eis Voorzorgsmaatregel	Stedin kent geen kabels en leidingen waarvoor een eis-vorzorgsmaatregel van toepassing is.
Huisaansluitschetsen	Schetsen van huisaansluitingen zijn niet bijgevoegd, indien gewenst zijn deze op te vragen via het e-mailadres bij de contactgegevens.
Detailkaarten	Detailkaarten zijn niet bijgevoegd, indien gewenst zijn deze op te vragen via het e-mailadres bij de contactgegevens. (gestuurde boringen e.d.)

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen:

Huisaansluitingen en detailtekeningen kunt u aanvragen via onze klicdesk:
(onder vermelding van klic-nummer)

E-mail: klicdesk@stedin.net

Vragen over de ontvangen klic-informatie via onze klicdesk
(bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur) via:

E-mail: klicdesk@stedin.net

Telefoon: 088 895 62 22

Een nieuwe (bouw)aansluiting, het wijzigen (omleggen) van - of verwijderen van kabels- en/of leidingen, dient u elektronisch aan te vragen via het centrale meldpunt:

Website: www.aansluitingen.nl

U kunt voor vragen betreffende uw aanvraag contact opnemen met onze klantenservice (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur) via:

Telefoon: 088 896 39 63

of indien van toepassing met uw accountmanager.

Onderwerp

Graaf of oriëntatiemelding

Pagina

2 van 4

Hoogspanning *[alleen indien HS aanwezig]*

Let op: Er bevinden zich mogelijk onder- of bovengrondse hoogspanningsverbindingen (50kV) in het gebied dat u hebt aangegeven als graaflocatie. Bij werkzaamheden in de directe omgeving van onder- of bovengrondse hoogspanningsverbindingen (50kV) dient u altijd binnen 3 tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden contact met op te nemen met onze klicdesk.

Houd er rekening mee dat er op uw graaflocatie ook andere netbeheerders met hoogspanning aanwezig kunnen zijn. Dit kunt u zien op de brief die u heeft ontvangen van het Kadaster naar aanleiding van deze graafmelding.

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. U kunt deze bestellen op www.crow.nl.

De CROW publicatie 250 is van toepassing op het gehele graafproces.

Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Onze klicdesk helpt u de kabel of leiding te (laten) lokaliseren.

Werkzaamheden in de directe nabijheid van midden-, hoogspanningskabels en hoge druk gasleidingen (> 1 bar) mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van operationeel netwerk verantwoordelijke.

De klicdesk zorgt dat u in contact komt met de operationeel netwerk verantwoordelijke.

Bij een gestuurde boring dient u altijd contact met ons op te nemen.

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij: **Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).**



Meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen, kunt u vinden in onze brochure "Graaf zorgvuldig". Deze kunt u downloaden op: www.stedin.net.

Met vriendelijke groet



Manager Netcoördinatie

Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen (ondergronds)

17 februari 2014

Heipalen, damwanden, boringen, sonderingen en dergelijke

Grondtrillingen en verzakkingen kunnen schade aan leidingen en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, moet de aannemer vooraf contact opnemen met onze Klicdesk, te bereiken op telefoonnummer 088 895 62 22 of via de mail klicdesk@stedin.net.

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de Stedin Netbeheer B.V. kabels en/of leidingen:

- | | | |
|---|---|--|
| • Bij het heien van palen en slaan van damwanden | → | minimaal 2 meter |
| • Bij het maken van boringen en sonderingen
(ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt) | → | minimaal 2 meter |
| • Het slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond
uitvoeren | → | niet boven kabels en/of leidingen
en minimaal 0,2 meter |
| • Bij het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van | → | minimaal 10 meter en binnen
10 meter vooraf contact
brosse leidingen (grijs gietijzer,
asbestcement) opnemen met
onze Klicdesk |

Voor werkzaamheden in of rond wateren en/of waterkeringen, verwijzen wij u naar de CROW publicatie 308: "Richtlijn zorgvuldig graafproces; kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen".

Graven

- Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met onze Klicdesk kunt u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken. De netbeheerder zal alsdan beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.
- Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met onze Klicdesk voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden, tenzij anders is overeengekomen.
- Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de Stedin eigendommen kan plaatsvinden.
- Kruisingen met Stedin kabels en/of leidingen dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
- Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.
- De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder zijn, dan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in onze hoofd- en aansluitleidingen niet gegarandeerd in alle gevallen trekvast zijn.

Sloten

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kunt u kabels en/of leidingen van ons tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met onze Klicdesk.

Onderwerp

Graaf of oriëntatiemelding

Pagina

4 van 4

Het planten van bomen en struiken

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de Stedin kabels en/of leidingen kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280: "Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen".

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met onze Klicdesk.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden dienen in acht te worden genomen nadat door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de Stedin kabels en/of leidingen:


- Bij het parallel leggen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Bij het kruisen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dient u aanvullende maatregelen te nemen na advies van onze schadepreventiemedewerker (te bereiken via onze klicdesk).

Werken bij afsluiters, stations e.d.

- Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van Stedin graag overleg plegen met onze schadepreventiemedewerker (te bereiken via onze klicdesk).
- Het is niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met obstakels zoals bouw kranen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.
- Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer: ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Werken bij hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten).

- Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen gelden andere veiligheidsvoorschriften.
- Bij werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsmasten of hoogspanningslijnen dient u altijd (vooraf, 3 tot 5 werkdagen) contact op te nemen met Stedin, via onze klicdesk.
- Voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dient u rekening te houden met een voorbereidingsperiode van 10 werkdagen.

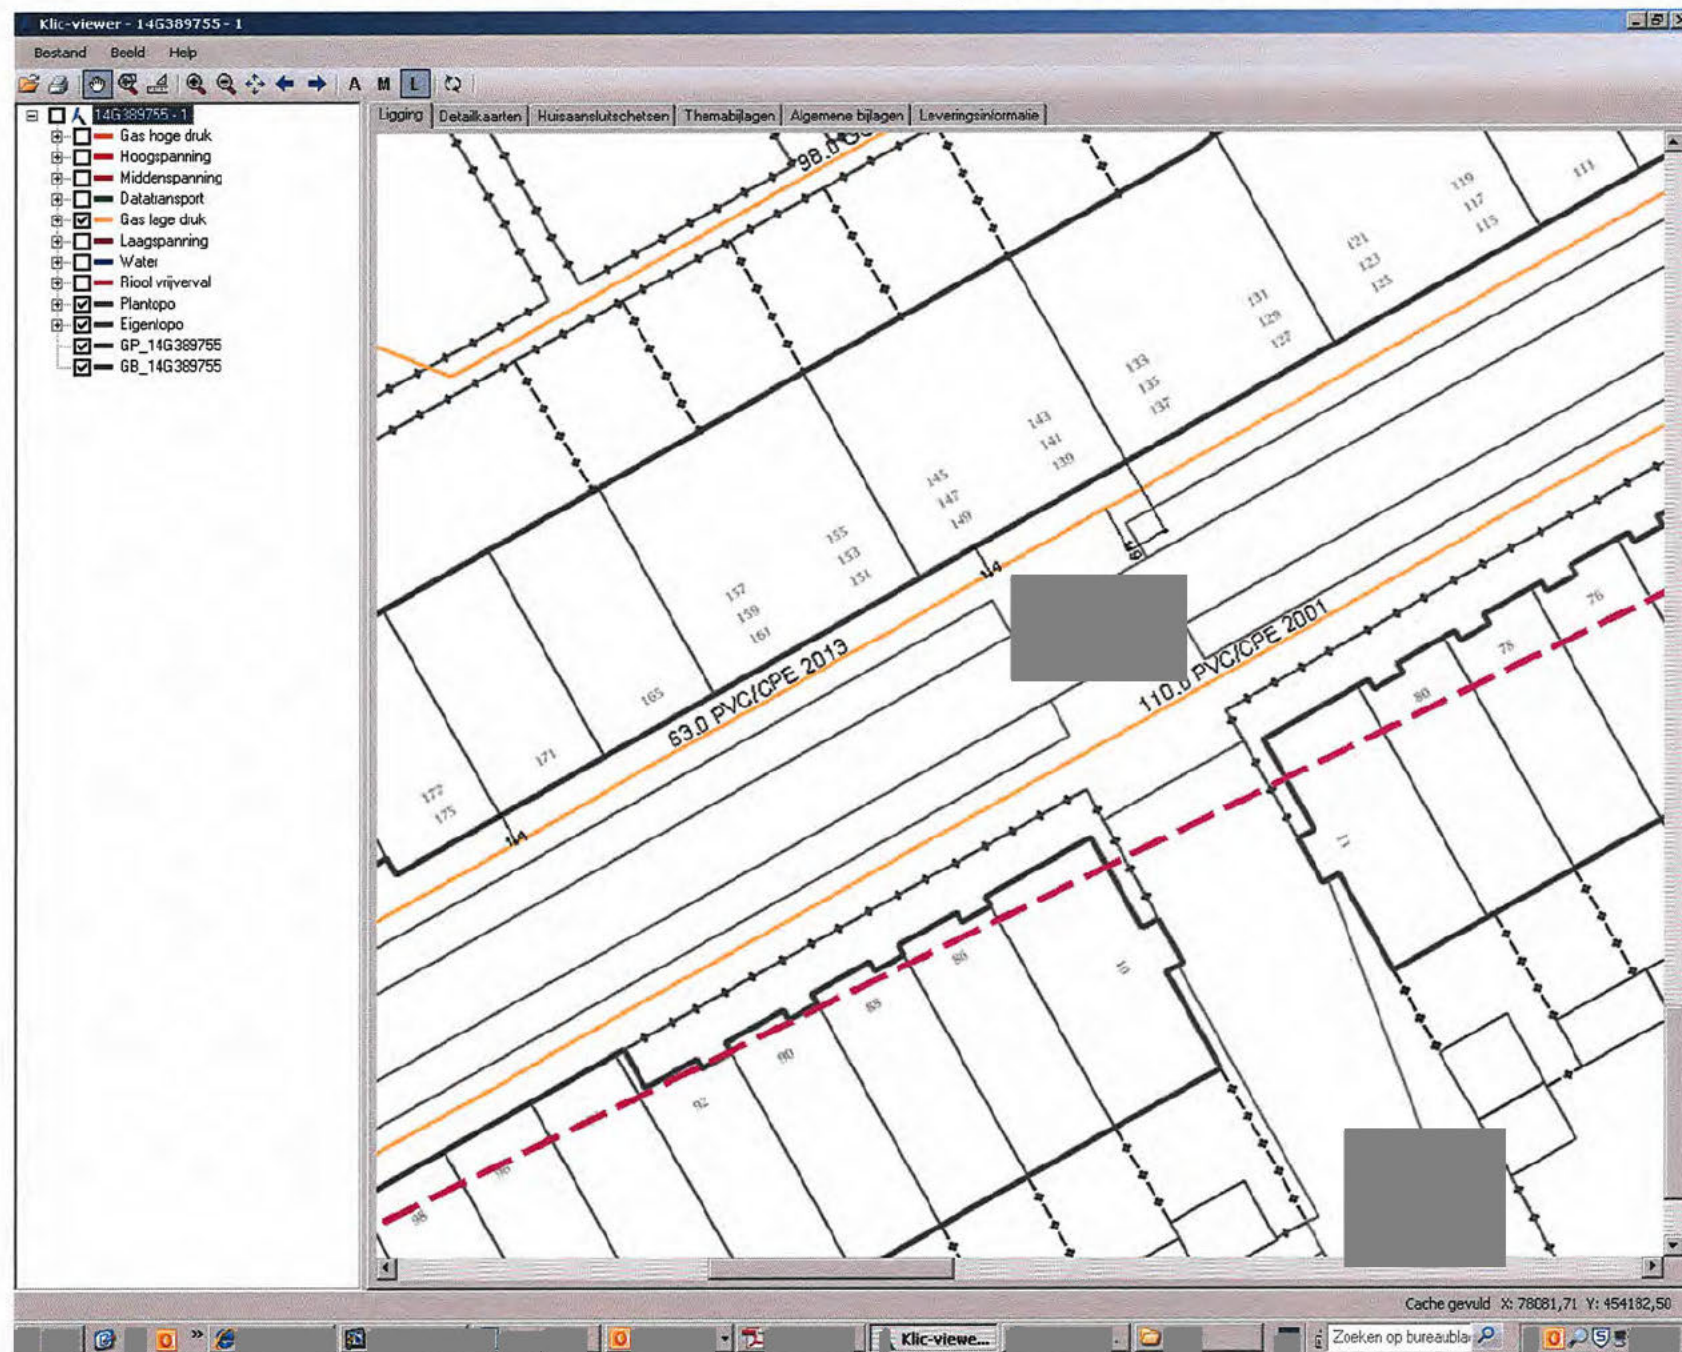



**Transcript van Telefoongesprek tussen [REDACTED] van Rutte
Wegenbouw en de telefonist van Stedin.
In dit gesprek meldt [REDACTED] het gaslek aan Stedin.**

Stedin: Goedendag met [REDACTED] (onverstaanbaar), waarmee kan ik u helpen?

Rutte: Goedendag u spreek met [REDACTED] firma Rutte. Wij plaatsen ondergrondse vuilbakken in den Haag momenteel en eh, ik ben een put aan het stellen en ik ruik opeens gas en nu zijn we gaan spitten en nu is ineens een gasleiding uit de mof geschoten.

Stedin: (onverstaanbaar antwoord). Waar is dat? Eh, eh,

Rutte: [REDACTED]

Stedin: eh, eh, eh,

Stedin: O, ik zie het al, hij vind hem niet, maar hij staat in 's Gravezande. Ja oooooo eh. (Wachten achtergrond geluid). Eh, [REDACTED]: welk huisnummer is dat?

Rutte: [REDACTED]

Stedin: [REDACTED] eens even kijken, de naam is?

Rutte: [REDACTED]

Stedin: U zei?

Rutte: van Rutte, Rutte Wegenbouw.

Stedin: Rutte eh wegenbouw, bereikbaar onder telefoonnummer?

Rutte: [REDACTED]. (Stedin herhaalt).

Stedin: We praten over gas is er nog steeds uitstroom of dat niet meer

Rutte: Nee, er komt nog steeds gas uit.

Stedin: Ja, het spuit er nog steeds uit. Ja eh, O.K gaan wij met spoed de monteurs bellen en die in gang sturen. Ik weet niet Is het een drukke straat of niet?

Rutte: Of het een drukke straat is? Nee wij hebben de straat afgesloten dus van alle kanten...

Stedin: Ahh O.K. Is veilig we hebben een spoed de monteurs komen die kant op. Ja?

Rutte: OK bedankt

Stedin: Graag gedaan tot ziens

Rutte: Dag

Bijlage 7
blad 2 van 2

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 april 2015 8:22
Aan: [redacted]
Onderwerp: opvolging Klic melding

Geachte [redacted]

Aan de hand van uw vraag van gisteren mbt opvolging van de Klic melding het volgende:

De melding [redacted] is geregistreerd in onze Klic opvolgingstool.
Er zijn in die tool geen kontakten met de melder geregistreerd. Ook is er bij de Klic desk geen vraag bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van huis-aansluitschetsen bekend. Er is geen melding van de start van de werkzaamheden bekend.
Zo dat wel het geval is zou hiervan een registratie in de tool zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Sr. Storingsspecialist

STEDIN^{NET}

Blaak 8, 3011 TA Rotterdam
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam
tel 088 896 31 44
fax 088 895 09 52
mob [redacted]

www.stedin.net

Stedin Netwerkt

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101

**Rutte**www.ruttegroep.nl**Rapportage****Den Haag**

Calamiteit 10 november 2014

Rapportage:**Beeldvorming: 6 november 2014****Opgesteld:****Datum: 15 november 2014****Paraaf:**



Op donderdag 6 november 2014 heb ik een opdracht gekregen van mijn uitvoerder [REDACTED] om een proefsleuf te graven in de [REDACTED]. De sleuf moest 3 meter lang en 1,5 meter diep worden om te kijken welke kabels en leidingen aanwezig zijn.

Na het opbreken van de tegels ben ik begonnen met graven op 30 centimeter vanuit de betonband gemeten. Ik kwam al gauw een paar kabels tegen op 70 centimeter diep en heb daarna mijn proefsleuf breder gemaakt. Op 45 centimeter vanuit de betonband kwam ik kabels tegen op 80 centimeter diep. Op 60 centimeter vanuit de betonband nog meer kabels op 90 centimeter diep. Terwijl ik aan het graven was zakte het zand weg van de kant van de gevel van de woning en kwam ik een gasleiding tegen op 70 centimeter vanuit de betonband en op 100 centimeter diep. Het zand bleef instorten en zo kwam ik ook een waterleiding tegen op 105 centimeter vanuit de betonband op 85 centimeter diep. Tussen de gasleiding en de waterleiding had ik ruimte om tot 120 centimeter diep te komen maar het zand bleef instorten dus heb ik zoveel mogelijk weggegraven zodat ik met mijn schep kon voorsteken tot 150 centimeter diep. Ik ben echter geen kabels of leidingen meer tegen gekomen. Ik heb toen de sleuf en de aanwezige kabels en leidingen op de foto genomen

Tijdens mijn graafwerkzaamheden ben ik aangesproken door [REDACTED] en die vroeg mij of de ondergrondse bakken er toch kwamen. Tevens kreeg ik een blikje cola van de oudere invalidebewoner.

Na het fotograferen ben ik de sleuf weer dicht gaan maken, om de 40 centimeter heb ik het zand verdicht met een Wackerstamper. Ik heb een halve bak zand bijbesteld omdat ik tekort had, ik dacht dit al tijdens het graven want het zand was vrij zacht wat ik had uitgegraven. Daarna heb ik de bestrating weer aangebracht en de locatie aangeveegd.

Mijn bevindingen, tekeningen, foto's en afmetingen verstrek ik aan mijn uitvoerder [REDACTED] via Whatsapp.

Kabel 1 30 cm uit de band 70 cm diep

Kabel 2 45 cm uit de band 80 cm diep

Kabel 3 60 cm uit de band 90 cm diep

Gas 70 cm uit de band 100 cm diep

Water 105 cm uit de band 85 cm diep

2x gas aansluiting 80 cm uit de band 60 cm diep onder het bordje met huis nummer

141/149 Stroom kabel 75 cm uit de band loopt van 90 cm diep naar 35 cm diep ook onder bordje met huisnummer 141/14949



1. Ik heb de locatie van de sleuf groen gearceerd op de bovenstaande foto.

2. Dit was het begin van de sleuf met de eerste kabels op 70 centimeter diepte.



3. De eerste kabels van dichtbij gefotografeerd.

4. Toen ik het weggezakte zand een beetje had weg geschent kwam ik een gasleiding tegen.



5. Daarna heb ik alle aanwezige kabels en leidingen vrijgemaakt en gefotografeerd.

6. Op deze foto zijn de aanwezige huisaansluitingen goed te zien.



Foto rapportage [redacted] Den Haag

Calamiteit 10 november 2014


Rapportage: [redacted]
Beeldvorming: 10 november 2014

Opgesteld: [redacted]
Datum: 7 februari 2015

Fotoreportage 10 november 2014



1 Ik neem foto's van de borden.

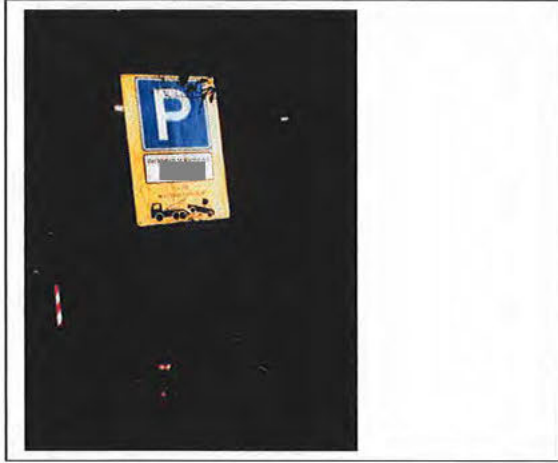

2 Het lijkt alsof het dezelfde borden zijn maar dat is niet het geval.



3 Ik moet dat doen omdat dit in mijn protocol staat.



4 Ik doe dit ook omdat ik meermaals ben tegengekomen dat er auto's staan en aan de hand van mijn fotomateriaal is terug te halen dat er borden op het tijdstip dat wij willen graven auto's staan.



5 Ik maak ook een foto van de straat en hang een onderbord op.




6 De wegafzettingen worden geplaatst.



7 Er staan een veelvoud aan borden.



8 Het is van belang dat er voldoende borden staan.

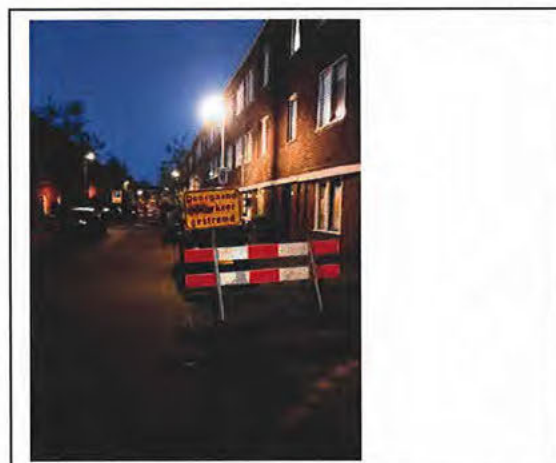


9 We hebben genoeg keer meegemaakt dat men gewoon doorrijdt, daarom plaatsen we borden om dit te voorkomen.




10 Borden in alle richtingen.



11 De entree van de locatie.

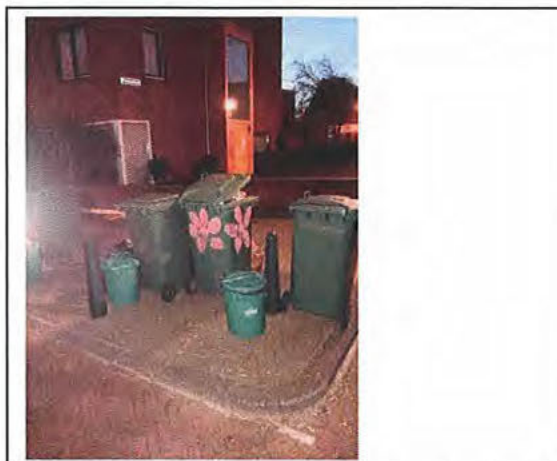

12 Vuilcontainers, veelal ligt er afval bij en dat ruimen wij op.

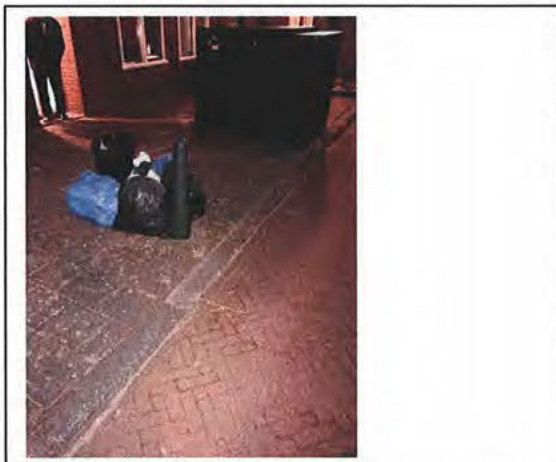

13 Het is nog vroeg en het scootmobielhuisje staat nog op zijn oude plaats.



14 Dit is de tekening, bij iedere locatie maak ik een dergelijke foto. Staat in het protocol.



15 Dit is de plaatsingstekening en hier staan de maatvoeringen op vermeld waar ik mij aan moet houden.



16 Dit is de KLIC van de KLIC-app. Werkt prima, altijd je KLIC-gegevens bij de hand.



17 Het monteren van de vloerdeksels.



18 Inspectie betonput, staat in het protocol.



19 Op zoek naar kabels en leidingen, dat doen wij ook bij iedere locatie. Kijken of de sleufbekisting kan worden geplaatst.



20 Bij iedere locatie doen wij dus kabels en leidingen onderzoek. Niet alleen in de grond daar waar de sleufbekisting komt, ook daarbuiten.




21 Wij doen dat vanuit de KLIC-gegevens en vanuit de proefsleufgegevens.



22 Wij doen onderzoek naar kabels en leidingen en wij graven dat met de schop.



- 23 Inwendige inspectie van de betonput. Ook dit is een onderdeel van het protocol.

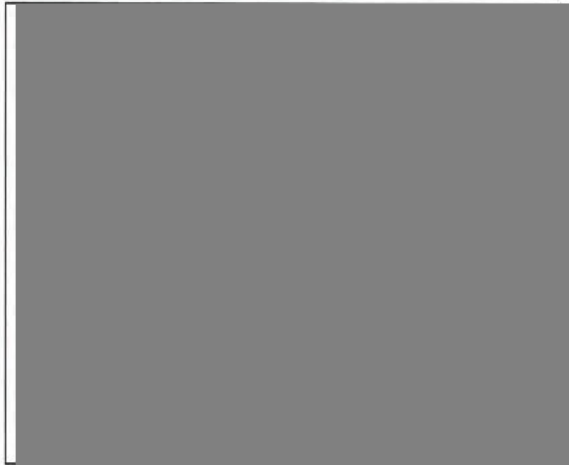

- 24 We vinden bij het graven naar kabels en leidingen een rioolhuisaansluiting.



- 25 Foto nr. 24 nader uitgelicht. Dit is de linker betonput gezien vanaf de weg. Deze aansluiting heeft niets van doen met de inmiddels bekende mof van de gasleiding.



- 26 Dit is de omlegging van de rioolhuisaansluiting.




- 27 Dit is de aansluiting van foto nr. 35.

- 28 Voor de veiligheid doen wij altijd een

hekwerk over de betonput.



29 Voor de gegevens meten we ligging van de leiding op.

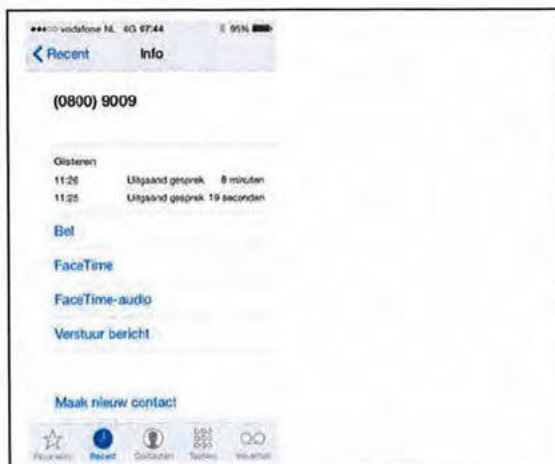

30 Dit is een uitdraai van mijn telefoon om aan te geven dat ik heb gebeld, 11.25 uur. Ik doe melding van de gaslucht.



31 Ik bel naar 112, 12.04 uur.



32 Voor mij een pijnlijk drama.



33 Brandweer in actie.



Rapportage

[redacted]
Den Haag

Calamiteit 10 november 2014

Rapportage: [redacted]

Beeldvorming: wk 44-46 november
2014

Opgesteld: [redacted]

Datum: 7 februari 2015

Voor de uitvoering van locatie 54.46 is het volgende schema tot stand gekomen. Bij iedere locatie is er overleg met de directievoerder. De locatie aan de [REDACTED] is daarop geen uitzondering.

1. Gegevens

In week 44, 27 oktober 2014 – 31 oktober 2014, heb ik de mappen voor de plaatsingsploeg van [REDACTED] hoofduitvoerder, opgehaald. Dit om in week 45, 3 november 2014- 7 november 2014 te plaatsen.

Week 44, donderdag 30 okt:

- Schouwen locatie 54.46
- Constatie dat "scootmobielbox" in locatie staat.
- Fotodocumentatie gemaakt.
- Directie, [REDACTED] op de hoogte gebracht en documentatie naar hem toegestuurd.
- [REDACTED] kwam ter plaatse.

[REDACTED] en ik samen met bewoner/ eigenaar "scootmobielbox" gesproken over evt. extra kabel/lus/m1 om de box zelf (aannemer Rutte) te verplaatsen. Bewoner wist ons te vertellen dat dit niet het geval kan zijn en er weinig rek op de kabel zit.

Vervolgens gaan [REDACTED] en ik in overleg over de plaatsing van de putten.

We bespreken de richting van de te plaatsen putten. Dit met in achtneming dat de "scootmobielbox" voortijdig verplaatst zal worden.

Putten staan geprojecteerd in een voetgangersoversteekplaats. Te zien aan de verlaging van de trottoirbanden is het de bedoeling om dat er een voetgangersoversteekplaats komt bij deze locatie.

Het is zo dat ik tekeningen krijg en dan ga ik op pad om te onderzoeken of het mogelijk is om de plaatsing uit te voeren. Ik meet ter plaatse en dan stel ik vast of de tekening die ik dus direct van [REDACTED] krijg en die afkomstig is van de gemeente, of die maatvoering klopt. Het komt dan ook regelmatig voor dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd op die tekening, dan bel ik [REDACTED] op en dan kijken we er samen naar.

Het komt ook voor dat ik dan drie of vier locaties heb en dan maak ik daarvoor een afspraak met Erwin en dan rijden wij zagezegd een rondje.

Ten aanzien van de locatie [REDACTED] vind [REDACTED] het een goed plan en gaat achter het verplaatsen van de "scootmobielbox" aan.

[REDACTED] wijst de rechterzijde (met vooraanzicht) aan, als toekomstige plek voor de "scootmobielbox".

2. Uitstel

Week 45, maandag 03 nov:

[REDACTED] verzoekt de locatie later aan te brengen. Dit i.v.m. het laten verplaatsen van de "scootmobielbox".

Ik verplaats de plaatsingsdag van locatie 54.46 van 07 november 2014 naar 10 november 2014.

3. Locatiewijziging

Woensdag 05 nov:

Telefonisch contact met [REDACTED] 54.46 wordt nu 54.46A

Putten staan hierop meer naar de linkerzijde geprojecteerd.

[REDACTED] doet een verzoek tot voorsleuven. Dat wil zeggen, wij moeten kijken of voor de verplaatsing er geen kabels en leidingen in de weg liggen.

4. Voorsleuven

Donderdag 06 nov:

Grondwerker [REDACTED] gaat linkerzijde, op verzoek van [REDACTED] en op mijn aanwijzing, voorsleuven. Ik kan dat niet op eigen initiatief doen, ik kreeg daarvoor opdracht van de directie. Het ging er om, is variant 54.46A uit te voeren.

Naar aanleiding van [REDACTED] zijn bevindingen, is er contact geweest met de [REDACTED]

Naar aanleiding van de voorsleufbevindingen wordt door [REDACTED] besloten hoe de locatie wordt geplaatst. Dit met in achtneming van de tussenruimte welke op 30 oktober 2014 is besloten.

5. Voorbereiding tot uitvoering

Vrijdag 07 nov:

Ik ga de locatie 54.46A uitcijferen. Dat wil zeggen aan de hand van de tekeningen van Erwin ga ik de locatie uitzetten. Daarbij let ik op de hoogten en zet de locatie uit en geef de hoogte door aan de plaatsingsploeg en later aan de straatploeg.

[REDACTED] belt met mededeling dat de "scootmobielbox" wel verplaatst gaat worden.

Dit gaat maandagochtend tussen 08.00-09.00 gebeuren. Er komt dus weer een wijziging, werktekening 54.46A gaat niet door, wordt weer 54.46.

Die middag ben ik bij de locatie, [REDACTED] is er ook en ik geef aan dat wij de tegelkop rechterzijde vast zaterdag 08 nov zullen aanbrengen. Dit omdat wij dit tegelwerk nooit gerealiseerd krijgen op maandagochtend tussen 7.00 uur en 9.00 uur. Voor deze werkzaamheden hebben we toch wel 4.00 uur nodig. [REDACTED] is hier blij mee.

Het komt er dus op neer dat Rutte voor de aanvang van de werkzaamheden, plaatsing ondergrondse containers, in opdracht en op aanwijz van de directie een tegelplateau moet maken voor een "scootmobielbox".

Ik haal de straatmakersploeg bij de locatie om tekst en uitleg te geven.

[REDACTED] en ik informeren bewoner/eigenaar "scootmobielbox" over de aanvang van de werkzaamheden en werkwijze (dit i.v.m. scootmobiel en de sleutel van de box)

Bewoner reageert instemmend en behulpzaam.

De plaatsingsploeg komt die middag ook op locatie, die zetten de spullen al vast neer voor maandag. Samen met [] zetten wij de locatie uit. Daarvoor zet ik gele strepen op de straat zodat de betonputten in het voorgestelde stramien komen die [] noodzakelijk acht.

Ik doe dit bij alle locaties zodat er geen misverstand kan bestaan over de plaatsing. Bij deze locatie heb ik daar extra zorg aan besteed omdat de tussenmaat een afwijkende maat is. Daarom heb ik dit met nadruk gedaan omdat de tussenmaat van 2,00m voor de directie van belang is.

Wij hebben toestemming op de locatie op deze wijze te plaatsen.

6. Tegelplateau

Zaterdag 08 nov:

Straatmakersploeg brengt aan rechterzijde tegelkop (tegelplateau om "scootmobielbox" te verplaatsen) aan.

7. Uitvoering plaatsing containers

Maandag 10 nov:

We gaan over tot plaatsing.

Ik heb mijn werkzaamheden gedaan als altijd, ik krijg de tekeningen, ik neem contact op met [] en ik geef instructie aan de ploegen. Zo ook voor deze locatie. Ik ga naar de betreffende locatie en kijk wat de mannen doen. Daarna ga ik verder naar de andere mannen.

Vanmorgen dan ook het vaste ritueel, om 6.00 uur in de keet de werkmappen van de plaatsingsploegen, met instructie aan de plaatsingsploegen overhandigd. Onder het genot van een kopje koffie wordt door mij nogmaals de diverse aandachtspuntjes, en waar op te letten, voor verschillende locaties besproken. In dit specifieke geval geef ik aan dat de locatie 54.46 ook ter sprake is geweest.

Omstreeks 06.30 uur / 06.45 uur gaan de mannen naar hun locatie.

Hierna stap ik in de auto en ga als eerste naar de locatie 54.46. Daar kom ik om 7.00 uur aan. Vanuit de door mij ontvangen en besproken tekening van [] geef ik aan dat het van belang is dat er een tussenruimte is van 2.00m. Ik doel hiermee op de tussenruimte tussen de betonput vanuit de wegzijde naar de woningen gezien links en die aan de rechterzijde. Het is een herhaling van afgelopen vrijdag. Ik doe dat wel vaker omdat maatvoeringen van belang zijn.

Voor de beeldvorming, de locatie is dus een paar keer uitgezet en in deze dag is de maatvoering wederom gecontroleerd.

Ook komt de verplaatsing van de "scootmobielbox" aan de orde. Immers die stond op een plaats waar wij een betonput moeten plaatsen en die stond er in het eerste ontwerp niet. Nu moet die groene box op het zaterdag daar speciaal voor gemaakte tegelkop (tegelplateau) komen. Ook geef ik aan [] aan dat wij voor die mindervalide man van nr. [] loopschotten moeten neerleggen.

Mijn dag verliep als alle andere dagen tot het moment dat [] mij belde. [] belde om ±12.10 uur, ik direct naar de locatie. Wat ik aantrof was een grote ravage en dacht als eerste, als er maar geen slachtoffers zijn. Direct navraag bij [] was oké, wat gestrest, maar dat is niet vreemd. [] had wat verwondingen en moest naar het

ziekenhuis. [redacted] moest op een gegeven moment mee met de politie en kwam een paar uur later weer terug.

Dit was mijn relaas aangaande de gebeurtenis van 10 november 2014. Ik heb nog wat foto's gemaakt voor de plaatsing van de containers. Dat doe ik altijd zodat ik een beeld heb van hoe het was en hoe het is geworden.



1 Opname van 30 oktober 2014. Dit is huisnummer 139.



2 Hier moeten twee containers komen maar de scooterbox staat in de weg.



3 Beeld van de locatie.



4 Beeld van de locatie.



5 Beeld van de locatie.



6 Kopie van de planning met vermelding
tijdelijk on-hold locatie [redacted]



Rutte Wegenbouw
Osdorperweg 588
Postbus 9587
1006 GB Amsterdam
Tel. 020-410 65 65
Fax. 020-410 65 60
Email: wegenbouw@ruttegroep.nl

Bank: ABN AMRO
Rek.nr. 42.44.21.028
G.rek.nr. 99.41.42.765
K.v.K.nr. 341.11.949 Amsterdam
BTW nr. NL 807611384 B 01

