

Overzicht e-mail document en bijlagen

De eerstvolgende pagina('s) bevatten de inhoud van het e-mail document met naam: **planning NEC_clean.msg**

Daarnaast bevat deze e-mail bijlagen, in het onderstaande tabel staan de namen van de bijlagen en of ze meegenomen zijn in het huidige document.

Naam van bijlage	Aanwezig in dit bestand
Planning project herontwikkeling NEC-stadion dd 20200324 versie 0.2.pdf	Ja

From 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Subject **planning NEC**
To "5.1.2e@klokgroep.nl" <5.1.2e@klokgroep.nl>
Date March 24, 2020, 2:35:42 PM UTC

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hallo 5.1.2e

Hierbij de nieuwe planning waarbij het schetsontwerp gereed is in oktober 2020. De datum van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan komt hiermee na de datum van afloop van de koopovereenkomst met NEC te liggen maar dat wisten we al. Geen rekening is gehouden met zienswijzen en de beantwoording hiervan.

De datum voor een onherroepelijk bestemmingsplan kan nog verder in de tijd liggen omdat ook geen rekening is gehouden met een Raad van State procedure.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

projectleider



Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag


Bijlage: Planning project herontwikkeling
NEC-stadion dd 20200324 versie 0.2.pdf



Projectleider: 5.1.2e | 5.1.2e
 Planner: 5.1.2e | 5.1.2e
 Versie 0.2, status: concept
 Datum aanmaak: 05-12-2019
 Datum aanpassing: 24-03-2020

Planning project herontwikkeling NEC-stadion

Versie 0.2

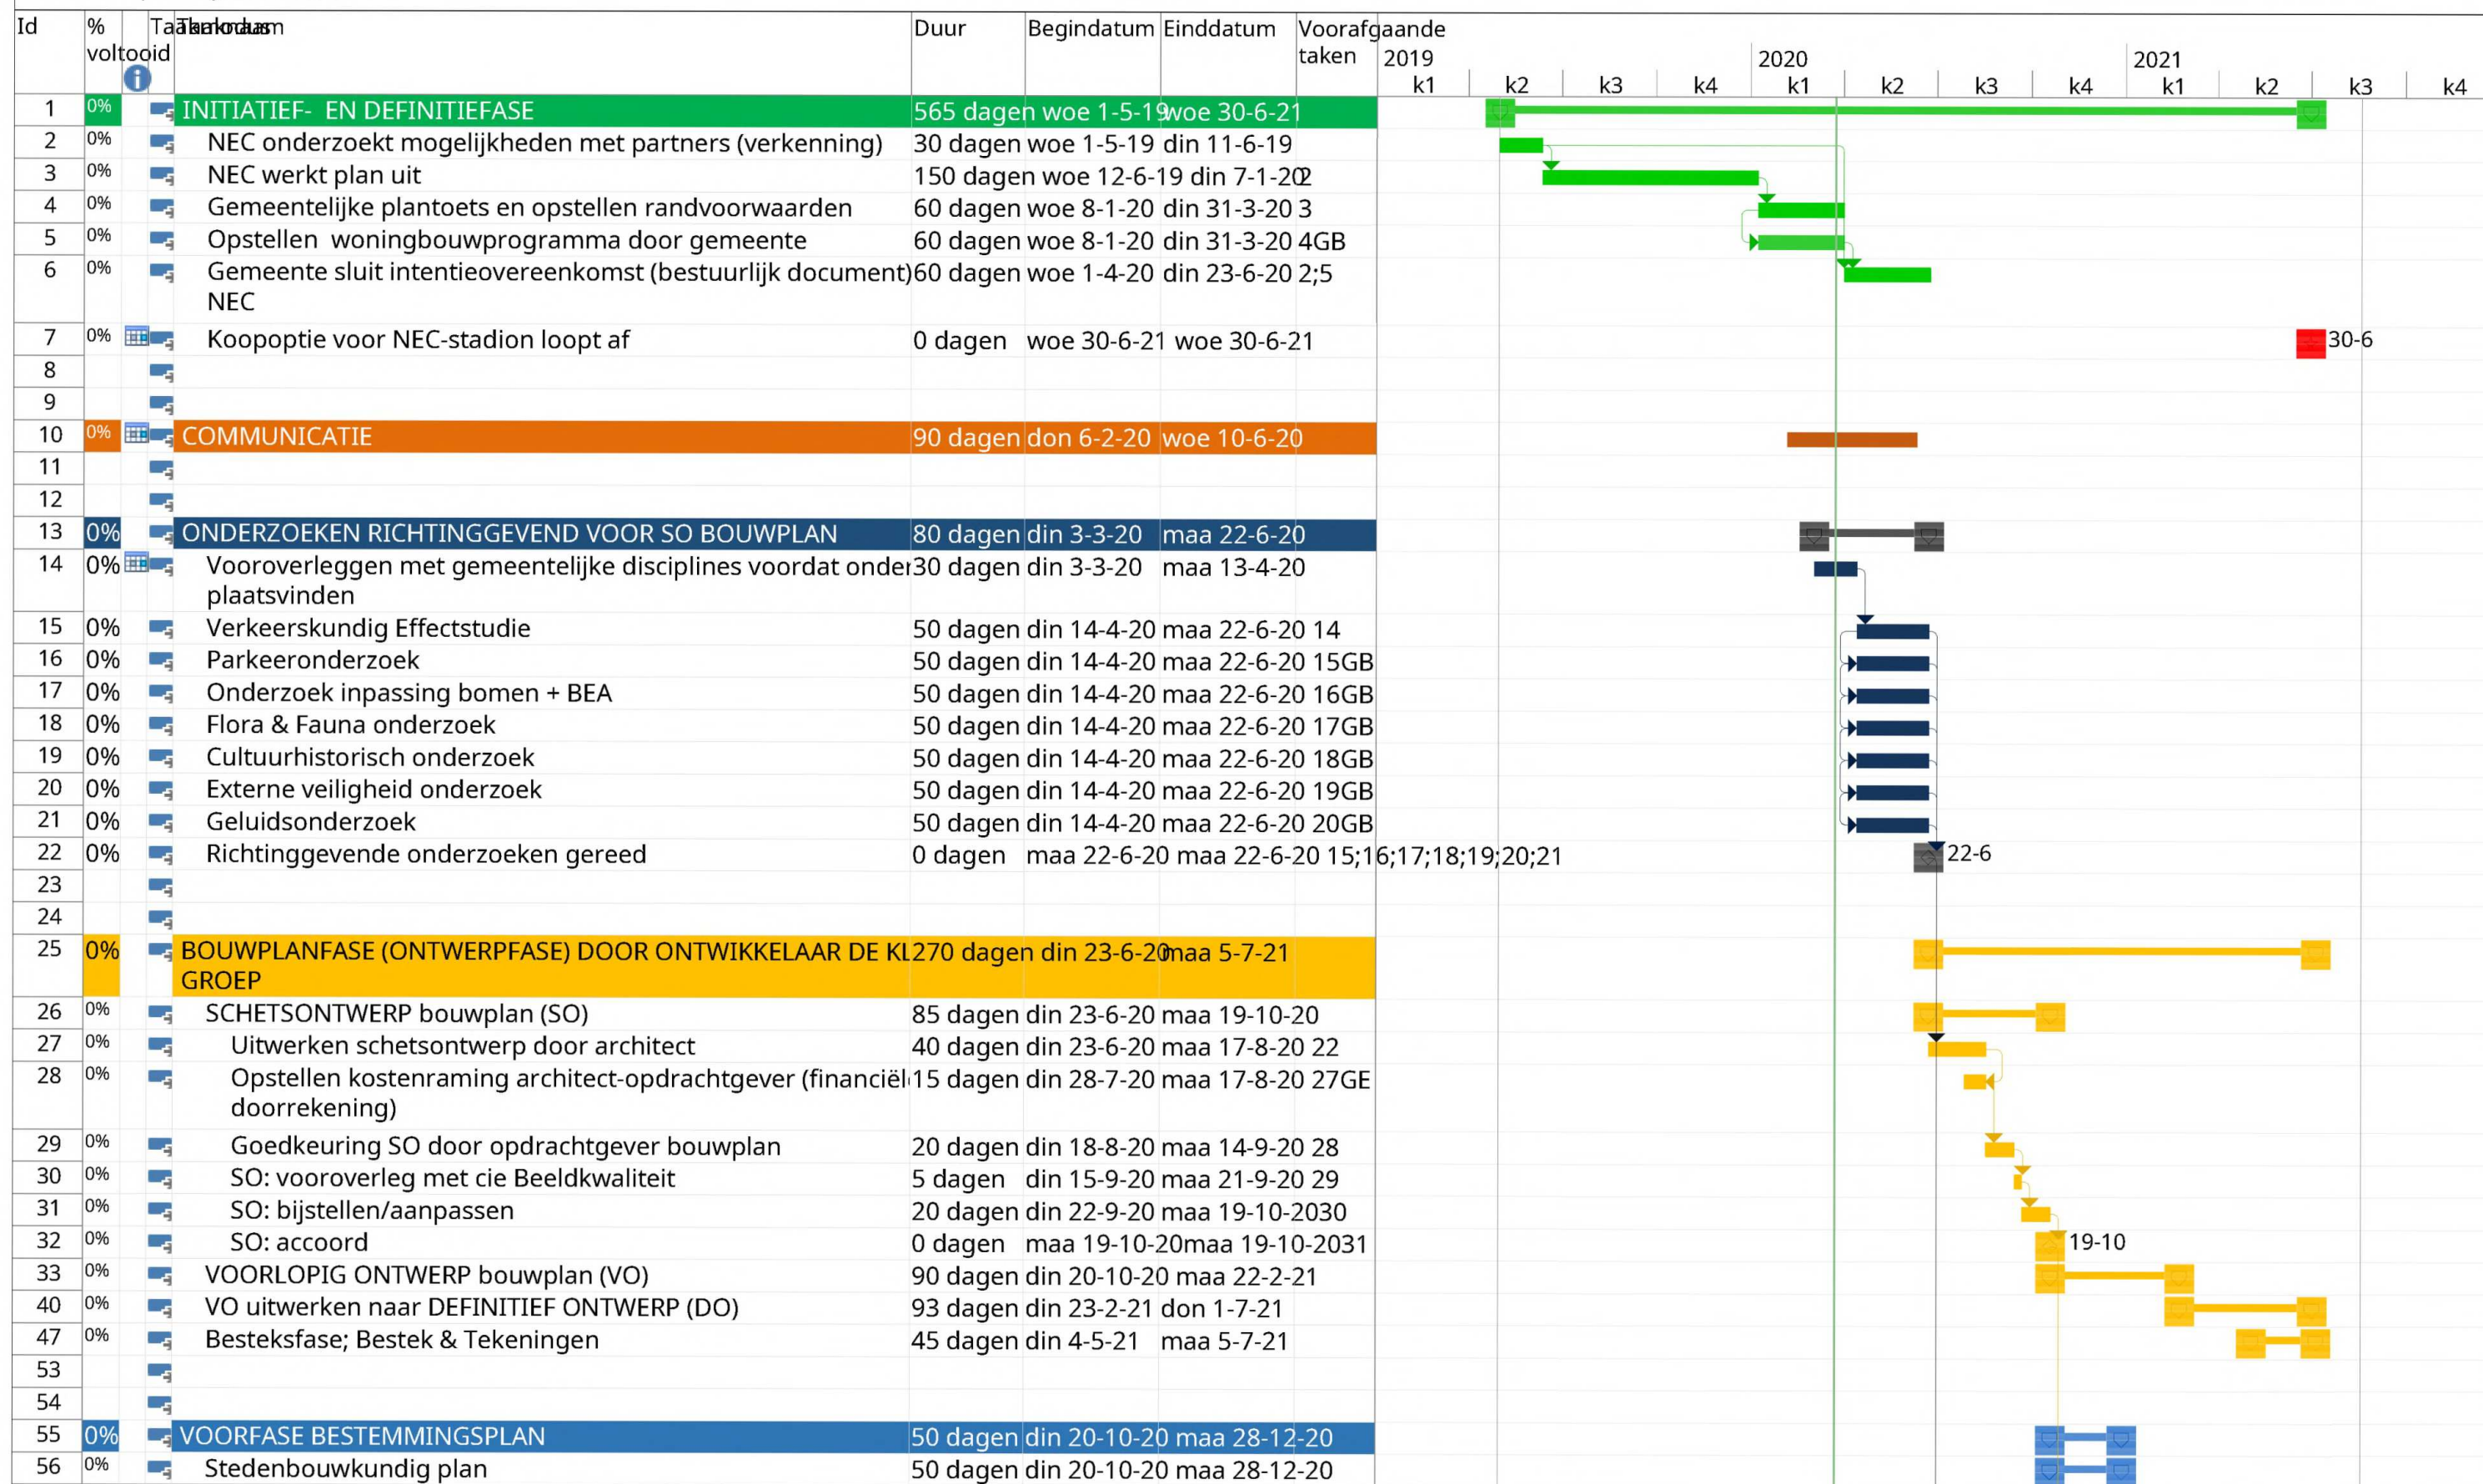

Projectleider: 5.1.2e 5.1.2e
 Planner: 5.1.2e 5.1.2e
 Versie 0.2, status: concept
 Datum aanmaak: 05-12-2019
 Datum aanpassing: 24-03-2020

Planning project herontwikkeling NEC-stadion

Versie 0.2



Id	% voltooid	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	2019				2020				2021			
							k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
57	0%	Opstellen van stedenbouwkundig plan (basis voor nieuw bestemmingsplan)	20 dagen	din 20-10-20	maa 16-11-20	32												
58	0%	Toetsen door gemeentelijke disciplines	10 dagen	din 17-11-20	maa 30-11-20	57												
59	0%	Voorleggen aan de cie beeldkwaliteit	10 dagen	din 1-12-20	maa 14-12-20	58												
60	0%	Aanpassen van stedenbouwkundig plan n.a.v. toetsen	10 dagen	din 15-12-20	maa 28-12-20	59												
61	0%	Stedenbouwkundig plan goedgekeurd	0 dagen	maa 28-12-20	maa 28-12-20	60												
62																		
63																		
64	0%	ONDERZOEKEN TBV BESTEMMINGSPROCEDURE	50 dagen	din 23-6-20	maa 31-8-20													
65	0%	Onderzoek inpassing bomen + BEA	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	22												
66	0%	Verkeerskundige Effectstudie	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	65GB												
67	0%	Verkeerslawaaï	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	66GB												
68	0%	Onderzoek stikstofdepositie na uitspraak PAS	50 dagen	din 23-6-20	maa 31-8-20	65GB												
69	0%	Bodemrapporten (grondonderzoek milieu)	50 dagen	din 23-6-20	maa 31-8-20	67GB												
70	0%	Parkeertoets	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	69GB												
71	0%	Flora & Fauna onderzoek	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	70GB												
72	0%	Onderzoek conventionele explosieven (OCE)	20 dagen	din 23-6-20	maa 20-7-20	71GB												
73	0%	Waterhuishoudkundig plan	50 dagen	din 23-6-20	maa 31-8-20	72GB												
74	0%	Archeologie (afspraken op schrift stellen)	50 dagen	din 23-6-20	maa 31-8-20	73GB												
75	0%	Externe veiligheid	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	74GB												
76	0%	Klic-melding + resultaten	10 dagen	din 23-6-20	maa 6-7-20	75GE												
77	0%	Onderzoeken en rapporten gereed, aanleveren bij gemeente	0 dagen	maa 31-8-20	maa 31-8-20	66;67;69;70;71;72;73;74;75;76;68												
78																		
79																		
80	0%	NIEUWE PROCEDURE BESTEMMINGSPROCEDURE (ex art. 3.217 + ogv C&H-wet)	217 dagen	din 20-10-20	woe 18-8-21													
81	0%	ONTWERP BESTEMMINGSPROCEDURE	217 dagen	din 20-10-20	woe 18-8-21													
82	0%	Juridische kaart maken + toelichting schrijven	10 dagen	din 20-10-20	maa 2-11-20	77;32;57GB												
83	0%	Voorschriften maken	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	82												
84	0%	Verkeersparagraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	83GB												
85	0%	Milieuparagraaf (Bodem-Geluid-Lucht)	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	84GB												
86	0%	Natuur- en landschapsparagraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	85GB												
87	0%	Externe veiligheidparagraaf (incl. brandweer)	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	86GB												
88	0%	Wonenparagraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	87GB												
89	0%	Waterparagraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	88GB												
90	0%	Archeologie- en cultuurhistorieparagraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	89GB												
91	0%	Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling paragraaf	25 dagen	din 3-11-20	maa 7-12-20	90GB												
92	0%	Toetsen juridische kaart (o.a. i.v.m. eventuele grondverkoop)	5 dagen	din 3-11-20	maa 9-11-20	91GB												
93	0%	Kostenbegroting	5 dagen	din 10-11-20	maa 16-11-20	92												
94	0%	Economische uitvoerbaarheid, resp. financiële paragraaf	10 dagen	din 24-11-20	maa 7-12-20	93GE;90GE												
95	0%	Toets bouwplan i.r.t. bsp door ODRN en projectontwikkelaar	10 dagen	din 8-12-20	maa 21-12-20	94												
96	0%	Overleg Waterschap en Provincie (max. 8 wk.)	40 dagen	din 8-12-20	maa 1-2-21	82;83;84;85;86;89;91;94;87;88												
97	0%	Afronden voorschriften etc. + advies schrijven	10 dagen	din 2-2-21	maa 15-2-21	96;95												

Projectleider: 5.1.2e 5.1.2e
Planner: 5.1.2e 5.1.2e
Versie 0.2, status: concept
Datum aanmaak: 05-12-2019
Datum aanpassing: 24-03-2020

Planning project herontwikkeling NEC-stadion

Versie 0.2



Id	% voltooid	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	2019				2020				2021			
							k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
98	0%	Voorbespreking met Wethouder	1 dag	maa 22-2-21	maa 22-2-21	97												
99	0%	Verzenden naar B & W	5 dagen	din 23-2-21	maa 1-3-21	98												
100	0%	Besluit B & W; vrijgave ontwerp-bsp voor ter visielegging	0 dagen	din 2-3-21	din 2-3-21	99												
101	0%	Vaststelling Bestemmingsplan	117 dagen	maa 8-3-21	woe 18-8-21													
102	0%	Bekendmaking	0 dagen	maa 8-3-21	maa 8-3-21	100BE+5 dagen												
103	0%	Ter visielegging B & W-besluit	30 dagen	don 11-3-21	woe 21-4-21	102BE+1 dag												
104	0%	Advies en Raadsvoorstel	12 dagen	don 22-4-21	vri 7-5-21	103												
105	0%	Verzenden naar B & W	5 dagen	maa 10-5-21	vri 14-5-21	104												
106	0%	Besluit B & W voor vaststelling	0 dagen	din 18-5-21	din 18-5-21	105												
107	0%	Verzenden naar Presidium voor politieke rondes	10 dagen	din 18-5-21	maa 31-5-21	106												
108	0%	Politieke avond: inspraakronde	1 dag	woe 9-6-21	woe 9-6-21	107												
109	0%	Politieke avond: gespreksronde	1 dag	woe 16-6-21	woe 16-6-21	108BE+4 dagen												
110	0%	Politieke avond: besluitronde (vaststellen Raad)	0 dagen	woe 30-6-21	woe 30-6-21	109BE+10 dagen												
111	0%	Publicatie Raadsbesluit	0 dagen	woe 7-7-21	woe 7-7-21	110BE+5 dagen												
112	0%	Ter visielegging Raadsbesluit	30 dagen	don 8-7-21	woe 18-8-21	111												
113	0%	Bestemmingsplan onherroepelijk danwel RVS-procedure	0 dagen	woe 18-8-21	woe 18-8-21	112												

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 2 4 5 6
